



Проектный портал на платформе Microsoft SharePoint

Группа компаний «ПМСОФТ», 2009 г.

Сколько стоит информация?

- Организация из 1000 служащих тратит ежегодно до \$ 2,5 млн. на издержки, связанные с использованием информации (по данным IDC)
- До 20% рабочего времени тратится на поиск документов (по данным PayBot LLC)



Проектный портал

Веб-решение, которое объединит все данные и взаимодействия по проекту и обеспечит бесперебойный доступ к актуальной информации в едином интерфейсе сотрудникам всех уровней в соответствии с правами доступа

Девелоперская компания МОНОЛИТ

Пользователь: Евгений Юревич | Мой узел | Мои ссылки

Портфель проектов

Узел: Портфель проектов

Девелоперская компания МОНОЛИТ | Карта проектов | Портфель проектов | Узел проекта | Узел департамента

Действия узла

Просмотреть все содержимое узла

Статистика проектов

Состояние проектов

Проекты по портфелю

Производственная программа 2009-2011

Стоимости проектов по ЦП

Фактическая стоимость по проектам

Корзина

Девелоперская компания МОНОЛИТ > Портфель проектов > Статистика проектов


Статистика проектов

Легенда: ✘ Критическая ⚠ Предупреждение ✔ Допустимый ★ Исключение

	На дату		Прогноз по завершении	
	Расчет расписания	Стоимость	Расчет расписания	Стоимость
Портфель проектов	✘ отстает на 79	✘ \$7,876,793 больше	⚠ отстает на 29	✔ \$5,577,386 больше
Дмитровское шоссе	✘ отстает на 176	✘ \$936,431 больше	✔ по графику	✘ \$1,958,718 больше
Коттедж на ул.Фрунзенская, 57	✔ опережает на 29	✔ \$1,256,002 меньше	✔ по графику	✔ \$1,505,937 меньше
Ленинградский пр-т, 32	✘ отстает на 177	✘ \$5,557,551 больше	⚠ отстает на 35	⚠ \$551,001 больше
Новые Черемушки, 17	✘ отстает на 50	✘ \$1,318,060 больше	✔ по графику	✔ \$140,007 больше
Проезд Маслова, вл.15-19	✘ отстает на 225	✔ \$289,206 меньше	⚠ отстает на 41	✔ \$326 больше
Старогородской бульвар, вл. 33	✔ отстает на 9	★ \$2,315,702 меньше	✔ по графику	✘ \$1,573,902 больше
Уфимский проезд, вл. 2-10	★ опережает на 54	★ \$2,741,904 меньше	✔ по графику	✘ \$2,859,373 больше
Хабаровск-Плаза, строение 3	✘ отстает на 83	✘ \$6,667,565 больше	⚠ отстает на 26	✔ \$5 меньше


Страница: 1 из 1

Функционально-ориентированный портал



- Организационные документы
- Информационные сервисы
- Корпоративные справочники
- Узлы подразделений

Проектно-ориентированный портал



- Проектные документы
- Ключевые показатели проектов
- Анализ портфеля проектов
- Узлы проектов

Единое информационное пространство



PM Проектный портал

Девелоперская компания МОНОЛИТ | Карта проектов | Портфель проектов | **Узел проекта** | Узел департамента | Действия узла

Просмотреть все содержимое узла

ДОКУМЕНТЫ

- Договорная документация
- Проектная документация
- Отчеты о ходе выполнения работ
- Корреспонденция

КАЛЕНДАРИ

СПИСКИ

- Поручения
- Контакты

ФОТОГРАФИИ

- Фотографии с площадки

Корзина


Структура проектов предприятия

- ВТ. Внутренние проекты
- ВШ. Внешние проекты
 - 1. Ленинградский пр-т, 32
 - 4. Хабаровск-Глаза, строение 3
 - 5. Новые Черемушки, 17
 - 1. Глава 1. Подготовка территории ПС
 - 2. Глава 2. Основные объекты строительства
 - 1. Порталы ОРУ 330 кВ
 - 2. Опоры под оборудование ОРУ 330 кВ
 - 3. Монтаж оборудования
 - 4. Создание АСУ ТП и СДТУ, АИИС КУЭ, ПА, ОПТ
 - 5. Монтаж оборудования ВОЛС
 - 6. Заходы
 - 7. Подвеска ВОЛС на опорах по трассе второй цепи ВЛ 330 кВ
 - 3. Глава 8. Временные здания и сооружения
 - 4. Глава 9. Прочие
 - 5. Поставка оборудования
 - ВШ. КТ. Строительство загородных коттеджей (объекты на продажу)
 - 2. Коттедж на ул. Фрунзенская, 57


Проектная документация

Тип	Имя	Цены года	Версия	Автор изменений	Изменен
Тип сметы : Локальная смета (4)					
	420026220	2000	38.0	Дмитрий Никофоров	30.01.2009 14:42
	420026210	2004	44.0	Дмитрий Никофоров	30.01.2009 14:41
	420024711	1984	38.0	admin	30.01.2009 14:37
	420024530	2006	40.0	Евгений Юревич	30.01.2009 14:31
Тип сметы : Локальный ресурсный сметный расчет (5)					
	420026223	2000	38.0	Евгений Юревич	30.01.2009 14:43
	420026213	2000	41.0	Дмитрий Никофоров	30.01.2009 14:41
	420024713	2008	38.0	Дмитрий Никофоров	30.01.2009 14:40
	420024713	2000	38.0	Дмитрий Никофоров	30.01.2009 14:40
	420024533	2006	40.0	admin	30.01.2009 14:36
Тип сметы : Локальный сметный расчет (4)					
	420026221	2000	38.0	Евгений Юревич	30.01.2009 14:42
	420026211	2000	38.0	Дмитрий Никофоров	30.01.2009 14:41
	420024710	1991	38.0	admin	30.01.2009 14:37
	420024531	2000	40.0	Евгений Юревич	30.01.2009 14:31
Тип сметы : Сводка стоимости затрат труда (3)					
	420026223	2006	38.0	Евгений Юревич	30.01.2009 14:43
	420026213	2000	38.0	Дмитрий Никофоров	30.01.2009 14:42
	420024533	2004	40.0	admin	30.01.2009 14:37





Добавить документ



Договорны
е
документы



Проектная
документаци
я



Поручения
исполнителя
м

Графически
е
материалы

Отчетнос
ть

Модули Проектного портала

Работа
в офисе



Удаленный
доступ

Авторизация и
аутентификация

Проектный
документооборот

Аналитическая
отчетность

Архива проектной
документации

Интеграция с Primavera
Web

ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ

Контроль исполнения
поручений

Табель сотрудников

Возможности Проектного портала

В офисе



Удаленно

Авторизация и
аутентификация

Совместная работа с
документами и
бизнес-процессы
документооборота

Аналитические отчеты
и ключевые
показатели

Структурированное
хранилище
информации и
контекстный поиск



ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ

Контроль проекта и
портфеля проектов,
ведущихся в ИСУП
Primavera

Ведение протоколов и
контроль исполнения
поручений

Учет и контроль
рабочего времени
сотрудников

Модуль «Документооборот»

Документооборот

- Процедуры согласования документов в соответствии с регламентированными бизнес-процессам Заказчика
- Разграничение прав доступа до уровня документа
- Контекстный поиск: по атрибутам документов и по содержимому
- Учет версионности документов, ведение журнала всех опубликованных и промежуточных версий, контроль текущего состояния документов
- Автономная работа с документами, синхронизация версий документов, задач и календарных событий через Microsoft Outlook

Документооборот по проекту

Девелоперская компания МОНОЛИТ

Пользователь: Ирина Дорони娜 | Мой узел | Мои ссылки

Список: Договорная докумен...

Действия узла

Кем извлечено | Изменен | Автор изменений

Дмитрий Никифоров | 05.03.2009 18:03 | Евгений Юревич

Категория документа: Договор Д/С (7)

20090226 Технический акт на методику планирования и контроля	1.1	Евгений Юревич	04.03.2009 17:06	Евгений Юревич	Евгений Юревич	Не начат	47 KB	Завершен	Утверждено
Договор на аудит внедрения Новое!	0.1								
Договор на подрядные работы Новое!	1.0	Дмитрий Никифоров							
Договор с ПМСОФТ - внедрение ИСУП в.2	1.1								
ДС к договору 200308-Р Новое!	0.2	Ирина							
Приложение 3 Спецификация на консультационные услуги Новое!	1.0								
Приложение 6 Сублицензионный договор Новое!	1.1								

Категория документа: Календарный план (2)

Приложение 1. К договор с ПМСОФТ календарный план Новое!	0.1								
Приложение 4 Календарный план Новое!	1.0		04.03.2009 16:57	Евгений Юревич	Евгений Юревич	Не начат	72 KB		

Категория документа: Спец. поставка АО (1)

Акт на поставку от 14.05.08	1.0		03.03.2009 18:57	Евгений Юревич	Евгений Юревич	Проверен	71 KB	Завершен	
-----------------------------	-----	--	------------------	----------------	----------------	----------	-------	----------	--

Категория документа: Спец. поставка ПО (1)

Приложение 1 Спецификация на поставку ПО и оборудования Новое!	1.1		05.03.2009 13:12	Дмитрий Никифоров	Евгений Юревич	Проверен	145 KB		
--	-----	--	------------------	-------------------	----------------	----------	--------	--	--

Категория документа: ТЗ (1)

Приложение 2 ТЗ Новое!	1.0		04.03.2009 17:00	Евгений Юревич	Евгений Юревич	Черновик	430 KB		
------------------------	-----	--	------------------	----------------	----------------	----------	--------	--	--

Контроль изменений документа

Контроль версионности документов

Сохраненные версии для 20090226 Технический акт на методику планирования и контроля.doc

Все версии этого документа перечислены ниже с указанием новых значений измененных свойств.

Номер ↓	Изменено	Автор изменений	Размер	Заметки
1.3	05.03.2009 18:04	Евгений Юревич	47 KB	
1.2	05.03.2009 18:03	Евгений Юревич	47 KB	
1.1	04.03.2009 17:06	Евгений Юревич	46,5 KB	
Это текущая опубликованная основная версия				
1.0	03.03.2009 18:20	Евгений Юревич	45,5 KB	
Название: Протокол ввода системы (блока) в опытную эксплуатацию				

Бизнес-процессы документооборота

Портал > Узел проекта «Монолит» > Договорная документация > Состояние рабочего процесса

Состояние рабочего процесса: Сбор отзывов

071 v2)

Эта страница

Запуск нов...

Сбор Доку...
объе...

Рабочие пр...

Выберите ра...

Имя

Выполняю...

Сейчас для

Завершенн...

Сбор отзы...

Утверждени...

Сведения о рабочем процессе

Инициатор: Evgeniy Yurevich Документ: Приложение 2 ТЗ
 Начато: 07.08.2008 18:40 Состояние: Завершен
 Последнее выполнение: 07.08.2008 18:43

Задачи

В этом рабочем процессе участникам назначены следующие задачи. Для изменения какой-либо задачи щелкните ее. Эти задачи можно также просмотреть в списке Задачи.

Кому назначено	Наименование	Срок	Состояние	Результат
Irina Kolosova	Рецензирование Приложение 2 ТЗ Новое!		Завершена	Рассмотрел Irina Kolosova
Olga Ismailova	Рецензирование Приложение 2 ТЗ Новое!		Завершена	Рассмотрел Olga Ismailova
Elena Balakshiy	Рецензирование Приложение 2 ТЗ Новое!		Завершена	Рассмотрел Elena Balakshiy

Журнал рабочего процесса

В этом рабочем процессе произошли следующие события.

Дата события	Тип события	Идентификатор пользователя	Описание	Результат
07.08.2008 18:40	Рабочий процесс инициирован	Evgeniy Yurevich	Начат процесс Сбор отзывов. Участники: Irina Kolosova, Olga Ismailova, Elena Balakshiy	
07.08.2008 18:40	Задача создана	Evgeniy Yurevich	Создана задача для Irina Kolosova. Срок: Нет	
07.08.2008 18:40	Задача создана	Evgeniy Yurevich	Создана задача для Olga Ismailova. Срок: Нет	
07.08.2008 18:40	Задача создана	Evgeniy Yurevich	Создана задача для Elena Balakshiy. Срок: Нет	
07.08.2008 18:42	Задача завершена	Olga Ismailova	Задача, назначенная участнику Olga Ismailova, завершена пользователем Olga Ismailova. Примечания: замечание у меня только одно: в документе идет ссылка на календарный план, актуальность которого я проверить не могу. У меня нет доступа к этому документу...	Рассмотрел Olga Ismailova
07.08.2008 18:42	Задача завершена	Irina Kolosova	Задача, назначенная участнику Irina Kolosova, завершена пользователем Irina Kolosova. Примечания: С моей стороны замечаний нет. Календарный план проверила. Всё в порядке!	Рассмотрел Irina Kolosova
07.08.2008 18:43	Задача завершена	Elena Balakshiy	Задача, назначенная участнику Elena Balakshiy, завершена пользователем Elena Balakshiy. Примечания: Версия документа утверждена и согласована. Документ можно передавать заказчику.	Рассмотрел Elena Balakshiy
07.08.2008 18:43	Рабочий процесс завершен	Evgeniy Yurevich	Процесс Сбор отзывов завершен.	

Контроль текущих задач по документу

Сохранение подробной истории работы с документом

Отчетная информация по бизнес-процессам документооборота

МОНОЛИТ | Портфель проектов | **Узел проекта** | Узел департамента | Интеграция с Outlook | Действия узла

Договорная документация - просмотр отчетов категории Рабочий процесс

Эти отчеты используются для отслеживания хода выполнения деловых процедур на основе анализа сведений о предшествующей обработке этих рабочих процессов.

[Вернуться к библиотеке "Договорная документация"](#)

- Документ: Сбор отзывов**
 - Отчет о длительности работы
Этот отчет содержит сведения о том, как долго выполняется каждая операция в данном рабочем процессе, и сколько времени занимает выполнение каждого экземпляра.
 - Отчет об отменах и ошибках
Этот отчет содержит сведения о том, какие рабочие процессы были отменены прежде, чем были завершены, или закончились с ошибками.
- Документ: Сбор подписей**
 - Отчет о длительности работы
Этот отчет содержит сведения о том, как долго выполняется каждая операция в данном рабочем процессе, и сколько времени занимает выполнение каждого экземпляра.
 - Отчет об отменах и ошибках
Этот отчет содержит сведения о том, какие рабочие процессы были отменены прежде, чем были завершены, или закончились с ошибками.
- Документ: Утверждение**
 - Отчет о длительности работы
Этот отчет содержит сведения о том, как долго выполняется каждая операция в данном рабочем процессе, и сколько времени занимает выполнение каждого экземпляра.
 - Отчет об отменах и ошибках
Этот отчет содержит сведения о том, какие рабочие процессы были отменены прежде, чем были завершены, или закончились с ошибками.

Контроль длительности бизнес-процессов

Анализ ошибок и ранее запущенных процессов

Модуль «Архив проектной документации»

Архив проектной документации

- Централизованное хранилище проектно-сметной, договорной и другой документации в привязке к структурам ИСУП на базе Primavera – узлам EPS, проектам, пакетам работ
- Доступ к структурам ИСУП через Проектный портал с учетом назначенных в Primavera прав доступа
- Категоризация документов по типам, структуризация в соответствии с содержанием проекта
- Настраиваемые представления документов внутри архива – порядок полей, группировка, сортировка и фильтры

Архив проектной документации

Девелоперская компания МОНОЛИТ

Пользователь: Евгений Юревич | Мой узел | Мои ссылки

Узел: Узел проекта

Девелоперская компания МОНОЛИТ | Карта проектов | Портфель проектов | **Узел проекта** | Узел департамента

Действия узла

Просмотреть все содержимое узла

ДОКУМЕНТЫ

- Договорная документация
- Проектно-сметная документация
- Отчеты о ходе выполнения работ
- Корреспонденция

КАЛЕНДАРИ

- Совещания и планерки

СПИСКИ

- Поручения
- Контакты

ФОТОГРАФИИ

- Фотографии с площадок

Корзина

Девелоперская компания МОНОЛИТ > Узел проекта

Структура проектов предприятия

- 6. Внедрение системы управления проектной деятельностью
 - 1. Опытно-промышленная эксплуатация
 - 2. Результаты
 - 3. Совещания
 - 4. Предпроектная подготовка
 - 6. Организационные вопросы
 - 7. Подсистемы
 - 1. Интеграция Primavera — Directum
 - 2. Финансово-договорное обеспечение на базе PM.contract
 - 3. Проектный портал на базе Microsoft SharePoint
 - 5. Доработка функционала Directum
 - 7. КСР на базе Primavera
- 1. Ленинградский пр-т, 32
 - 12. Проектно-изыскательные работы
 - 2. Основные объекты строительства
 - 3. Объекты производного и обслуживающего назначения
 - 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
 - 6. Сети в транспортном хозяйстве
 - 7. Вертикальный транспорт
 - 9. Пуско-наладочные работы
- 4. Хабаровск-Г...
 - 1. ОБОРУДОВАНИЕ
 - 2. Глава 2. Основные объекты строительства
 - 3. Глава 9. Прочие работы
 - 4. Глава 8. Временные здания и сооружения
 - 5. Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
 - 7. Глава 7. Благоустройство территории
 - 8. Глава 1. Подготовка территории строительства

Привязка документов к структурам ИСУП Primavera: проектам, WBS, работам

Проектно-сметная документация

Тип сметы: Локальная ресурсная ведомость (4)

Тип	Имя	Цены года	Версия	Автор изменения	Изменен
	bp420026221	2006	38.0	Евгений Юревич	30.01.2009 14:52
	bp420026211	2004	38.0	Евгений Юревич	30.01.2009 14:50
	bp420024711	2004	38.0	Евгений Юревич	30.01.2009 14:48
	b420026211	2006	38.0	Евгений Юревич	30.01.2009 14:46

Тип сметы: Сводка стоимости затрат труда (3)

Тип	Имя	Цены года	Версия	Автор изменения	Изменен
	bp420024531	2008	40.0	Евгений Юревич	30.01.2009 14:47
	b420026221	2008	38.0	Евгений Юревич	30.01.2009 14:47
	b420024711	2000	41.0	Евгений Юревич	30.01.2009 14:45

Добавить документ

Архив корреспонденции по проекту

Узел проекта

Девелоперская компания МОНОЛИТ > Карта проектов > Портфель проектов > **Узел проекта** > Узел департамента > Интеграция с Outlook

Список: Корреспонденция

Девелоперская компания МОНОЛИТ > Узел проекта > Корреспонденция

Корреспонденция

Создать Отправить Действия Параметры

Представление: Вид коррес

Тип	№	Имя	дата создания	Вид документа	От Кого	Кому
Вид корреспонденци : Входящая (2)						
	№9459-12-56	20081223 Письмо об организации дальнейших работ	03.03.2009	Информационное письмо	Балашов Г.Ю.	Ирина Доронина
	№9453-78-09	20090219 Сопроводительное письмо к отчетам и процессам	03.03.2009	Протокол	Андреев К.А.	Ирина Доронина
Вид корреспонденци : Исходящая (4)						
	№9945-12-45	20090217 Гарантийное письмо	03.03.2009	Протокол	Бороисов А.Д.	Евгений Юревич
	№9435-76-23	20090226 Технический акт на методику планирования и контроля	03.03.2009	Протокол	Абрамов В.Ю.	Дмитрий Никифоров
	№9234-42-13	20090222 Сопроводительное письмо к отчетам и процессам Новое!	05.03.2009	Информационное письмо	Астахов Б.Н.	Алексей Божко
	№9345-56-98	Информационное письмо Новое!	05.03.2009	Протокол	Депрак А.Г.	Алина Бугаенко

Ведение архива входящей\исходящей корреспонденции по проекту

Поддержка всех популярных офисных форматов

и функции контекстного поиска

Модуль «Ведение протоколов и контроль поручений»

Ведение протоколов и контроль поручений

- Фиксация всех поручений, определенных в ходе совещаний, контроль их выполнения
- Для каждого поручения определяется ответственное лицо, отслеживается статус и срок выполнения
- Гибкая система уведомлений по электронной почте о новых поручениях, изменениях статуса выполнения текущих поручений
- Настраиваемые печатные формы отчетов о проведенных совещаниях и исполнении поручений

Контроль за исполнением протоколов

Домашняя
Контроль

Просроченные мероприятия

Описание	Срок	Ответственный	Исполнитель
Состояние: В работе (4)			
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (О.Е.Аксютин), ООО «Бургаз» (А.Г.Росинский), ООО «Газобезопасность» (В.Е.Довбин), ООО «Газпром Северодвинск» (В.В.Дмитрук), ОАО «Газпром добыча» (В.В.Милославский) представить в Департамент по добыче газа, газового конденсата, нефти положение по взаимодействию Заказчика, подрядных и супервайзерских организаций при строительстве, освоении и обжиге скважин, с учетом одобренной технологической схемы организации работ по контролю за качеством строительства скважин Бованенковского НГКМ (с...	30.08.2008	Крутиков Игорь Викторович; Черепанов Всеволод Владимирович; Старцев Александр Иванович;	Osadec Aleksey Stepanovich

Портал > Протоколы совещаний

Протоколы совещаний

» Вернуться к списку протоколов.

Тема: Выездное совещание руководителей и специалистов Департамента по добыче газа, газового конденсата и нефти

Даты совещания: 27.05.2008 0:00 - 29.05.2008 23:59

Место проведения: Проведено

Состояние: Проведено

Номер протокола: 345

Дата протокола: 24.05.2008 18:00

КОНТРОЛЬ
Контроль мероприятий по срокам и состояниям выполнения.

ОТЧЕТ
Отчет по мероприятиям.

МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия по протоколу.

Повестка

Тема	Время
...	27.05.2008 16:00
...	28.05.2008 18:00

Добавить элемент

Участники

Фамилия	Имя	Отчество	Дата совещания
...	27-30.05.08

Добавить элемент

Мероприятия

№	Ответственный	Исполнитель	Срок	Описание	Состояние	Примечания	Изменить
1	Зинаидова Татьяна Иосифовна; Крутиков Игорь Викторович; Черепанов Всеволод Владимирович; Морозов Игорь Сергеевич; Денгылина Ирина Анатольевна		01.09.2008	...	Выполнено	...	
2	Крутиков Игорь Викторович; Черепанов Всеволод Владимирович; Старцев Александр Иванович;	Osadec Aleksey Stepanovich	30.08.2008	...	В работе	...	

Администрирование совещаний и ведение протоколов на портале проекта

Печатная версия согласованного протокола, готовая для подписи участниками.

20

© Copyright PMSOFT 2009. All Rights Reserved

Контроль за исполнением поручений

Девелоперская компания МОНОЛИТ

Пользователь: Евгений Юревич | Мой узел | Мои ссылки

Узел проекта

Девелоперская компания МОНОЛИТ > Узел проекта > Поручения

Список: Поручения

Представление: Активные задачи (по ...)

Графическое отображение состояния выполнения поручения

Название	Состояние	Дата начала	Дата окончания	Детали	Место	Состояние выполнения	% завершения
Кому назначено : Алина Садукевич (5)							
Рассылка материалов	В процессе выполнения	24.02.2009	27.02.2009	Планерка ДПРиТ от 24.02.09	9.Дмитровское шоссе	<div style="width: 60%;"><div style="width: 60%;"></div></div>	60%
Письмо	Отложенные	09.02.2009	13.02.2009			<div style="width: 20%;"><div style="width: 20%;"></div></div>	20%
Расчеты по внедрению услуги Хостинг Primavera	В процессе выполнения	17.12.2008	17.12.2008			<div style="width: 30%;"><div style="width: 30%;"></div></div>	30%
Итоги прошлых директоров: Организация технической поддержки порталных решений	В процессе выполнения	17.12.2008	17.12.2008	Директорат 10.12.2008		<div style="width: 90%;"><div style="width: 90%;"></div></div>	90%
Итоги прошлых директоров: Экономика деловой игры	В процессе выполнения	17.12.2008	17.12.2008	Планерка ДПРиТ от 24.02.09		<div style="width: 70%;"><div style="width: 70%;"></div></div>	70%
Кому назначено : Дмитрий Никифоров (4)							
Передать документацию с исправлениями	В процессе выполнения	24.02.2009	27.02.2009	Планерка ДПРиТ от 24.02.09		<div style="width: 65%;"><div style="width: 65%;"></div></div>	65%
Сопровождение проекта	В процессе выполнения	26.01.2009	31.01.2009	Планерка ДПРиТ от 09.02.09г	7.р-н Марьино вл. 12	<div style="width: 10%;"><div style="width: 10%;"></div></div>	10%
Презентация	Отложенные	24.12.2008	16.01.2009	Планерка ДПРиТ от 24.02.09	2.Коттедж на ул.Фрунзенская, 57	<div style="width: 20%;"><div style="width: 20%;"></div></div>	20%
Проверить выгрузку стенда на виртуальную машину, доступную в офисе	В процессе выполнения	22.12.2008	24.12.2008			<div style="width: 70%;"><div style="width: 70%;"></div></div>	70%
Кому назначено : Евгений Юревич (4)							
Вопросы по выпуску нового продукта для построения web-отчетности	Не начата	17.03.2009	08.04.2009	Планерка ДПРиТ	9.Дмитровское шоссе	<div style="width: 0%;"><div style="width: 0%;"></div></div>	0%
Регламент по ведению планерок и директоров	В процессе выполнения	17.03.2009	24.03.2009	Планерка ДПРиТ		<div style="width: 70%;"><div style="width: 70%;"></div></div>	70%
Семинар о новых документах	В процессе выполнения	16.02.2009	16.03.2009	Планерка ДПРиТ от 16.02.2009	2.Коттедж на ул.Фрунзенская, 57	<div style="width: 80%;"><div style="width: 80%;"></div></div>	80%
ДС о переносе сроков	В процессе выполнения				Коттедж на ул.Фрунзенская, 57	<div style="width: 50%;"><div style="width: 50%;"></div></div>	50%
Кому назначено : Ирина Доронина (4)							
Подготовка документа "Функционал проектного портала"	В процессе выполнения			26.01.09		<div style="width: 70%;"><div style="width: 70%;"></div></div>	70%
Письмо	В процессе выполнения	22.12.2008	26.12.2008	Планерка ДПРиТ	9.Дмитровское шоссе	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div>	100%

Неисполненные поручения сотрудника

Модуль «Интеграция с Primavera Web»

Интеграция с Primavera Web

- Отображение детальных и сводных данных по проекту и/или портфелю проектов
- Актуальная информация из Primavera WEB в интерфейсе Проектного портала
- Поддержка механизма единой аутентификации (Single Sign-On) для доступа к данным Primavera Web по единому корпоративному логину
- Интерактивная карта территориального распределения проектов, позволяющая добавлять видео и фотографии с камер на площадках проектов

Структура проектов предприятия

Девелоперская компания МОНОЛИТ Пользователь: Евгений Юревич

Портфель проектов Узел: Портфель проектов

Девелоперская компания МОНОЛИТ | Карта проектов | **Портфель проектов** | Узел проекта | Узел департамента

Просмотреть все содержимое узла

Статистика проектов


Состояние проектов

Проекты по портфелю

Производственная программа 2009-2011

Стоимости проектов по ЦП

















Фактическая стоимость по проектам

 **Корзина**

Девелоперская компания МОНОЛИТ > Портфель проектов

Портфель проектов ОАО "МОНОЛИТ".

Структура проектов предприятия

- [-]  Девелоперская компания МОНОЛИТ
 - [-]  Внутренние проекты
 -  Внедрение системы управления проектной деятельностью
 - [-]  Внешние проекты
 - [-]  Строительство загородных коттеджей (объекты на продажу)
 -  Коттедж на ул.Фрунзенская, 57
 - [-]  Строительство бизнес-центров (объекты на продажу)
 -  Хабаровск-Плаза, строение 3
 -  Новые Черемушки, 17
 -  Ленинградский пр-т, 32
 - [-]  Собственное инвестирование
 -  Старогородской бульвар, вл. 33
 -  Дмитровское шоссе
 -  р-н Марьино вл. 12
 -  Проезд Маслова, вл.15-19
 -  Уфимский проезд, вл. 2-10

Иерархия проектов

«Паспорт» проекта

Девелоперская компания МОНОЛИТ

Портфель проектов

Девелоперская компания МОНОЛИТ | Карта проектов | Портфель проектов | Узел проекта | Узел департамента

Девелоперская компания МОНОЛИТ > Портфель проектов > Проекты Primavera > 4

Проекты Primavera: 4

Закреть

Создать элемент | Изменить элемент | Удалить элемент | Управление разрешениями | Оповестить меня

Id	4
Проект	Хабаровск-Плаза, строение 3
Руководитель проекта	Бугаенко Алина
Старт	01.03.2008 8:00
Финиш	28.03.2009 14:55
Старт по ЦП	01.03.2008 8:00
Финиш по ЦП	28.03.2009 14:55
Отк. от ЦП	-25,86
Факт. дл-ть	86
Ост. дл-ть	194
% выполнения	30,71%
Состояние	Объекты, переданные в эксплуатацию
Портфель	Производственная программа 2008-2011
Округ	ВАО
Код района	3
Документация	
Выполнение работ	Ведутся работы в текущем году
Ссылка на узел проекта	http://sp-ent:8080/portfolio/Pages/ProjectWorkspace.aspx?ProjectId=387&WbsId=3779
Старт по ЦП	01.03.2008 8:00
Финиш по ЦП	28.03.2009 14:55
Рабочее окружение	http://sp-ent:8080/portfolio/Pages/ProjectActivities.aspx?ProjectId=387&WbsId=3779
График	http://sp-ent:8080/portfolio/Pages/ProjectActivities.aspx?ProjectId=387&WbsId=3779
type	Project

Создан в 11.03.2009 14:59 пользователем: Евгений Юревич
Изменен в 25.03.2009 0:21 пользователем: Евгений Юревич

Закреть

Основные параметры и показатели проекта

Ссылка на узел проекта

Контроль исполнения проектов

Страницы отчетов по проектам и портфелю

Пользователь: Евгений Юревич | Мой узел | Мои ссылки

Узел: Портфель проектов

Действия узла

Девелоперская компания МОНОЛИТ > Портфель проектов > Состояние проектов

Состояние проектов

- ❌ **Дмитровское шоссе** выполнен на 26.1% в соответствии с расчетом процента выполнения. Выполняется с \$936,431 (52.2%) превышением бюджета и 176 (13.5%) отставанием от графика.
- ✅ **Коттедж на ул.Фрунзенская, 57** выполнен на 13.6% в соответствии с расчетом процента выполнения. Выполняется с \$1,256,002 (7.3%) недоиспользованием бюджета и 29 (8.2%) опережением графика.
- ❌ **Ленинградский пр-т, 32** выполнен на 6.7% в соответствии с расчетом процента выполнения. Выполняется с \$5,557,551 (1,171.3%) превышением бюджета и 177 (73.9%) отставанием от графика.
- ❌ **Новые Черемушки, 17** выполнен на 34% в соответствии с расчетом процента выполнения. Выполняется с \$1,318,060 (62.4%) превышением бюджета и 50 (19.1%) отставанием от графика.
- ❌ **Проезд Маслова, вл.15-19** выполнен на 42.3% в соответствии с расчетом процента выполнения. Выполняется с \$289,206 (2.1%) недоиспользованием бюджета и 225 (15.7%) отставанием от графика.
- ✅ **Старгородской бульвар, вл. 33** выполнен на 30.5% в соответствии с расчетом процента выполнения. Выполняется с \$2,315,702 (61.2%) недоиспользованием бюджета и 9 (0.5%) отставанием от графика.
- ★ **Уфимский проезд, вл. 2-10** выполнен на 33.9% в соответствии с расчетом процента выполнения. Выполняется с \$2,741,904 (49%) недоиспользованием бюджета и 54 (3.2%) опережением графика.
- ❌ **Хабаровск-Плаза, строение 3** выполнен на 14.2% в соответствии с расчетом процента выполнения. Выполняется с \$6,667,565 (184.9%) превышением бюджета и 83 (31.9%) отставанием от графика.

Страница: 1 из 1

Краткая сводка о ходе выполнения каждого проекта

Портфель проектов из Primavera Web

Формирование портфеля проектов на отдельном узле портала

Пользователь: Евгений Юревич | Мой узел | Мои ссылки |

Узел: Портфель проектов

Действия узла

Девелоперская компания МОНОЛИТ > Портфель проектов > Проекты по портфелю

Настроить

Вид: Список Группировка

Название	Ответственный	Старт	Финиш	Общ. стоимость по ЦП	Общая стоимость по завершении	% стоимости от плановой	% выполнения по стоимости
Портфель проектов		01-июн-04	22-ноя-11	\$232,809,351	\$238,386,737	24%	23.4%
Дмитровское шоссе	Бугаенко Алина	01-июн-04	30-июн-09	\$6,870,932	\$8,829,651	39.8%	30.9%
Коттедж на ул.Фрунзенская, 57	Алексей Божко	11-дек-07	12-авг-09	\$126,369,002	\$124,863,065	12.6%	12.7%
Ленинградский пр-т, 32	Юревич Евгений	01-янв-08	04-янв-09	\$7,131,856	\$7,682,857	84.6%	78.5%
Новые Черемушки, 17	Доронина Ирина	01-мар-08	31-дек-08	\$6,207,852	\$6,347,860	55.3%	54.1%
Проезд Маслова, вл.15-19	Доронина Ирина	18-апр-06	22-ноя-11	\$31,911,778	\$31,912,104	41.4%	41.4%
Старогородской бульвар, вл. 33	Бугаенко Алина	03-авг-04	02-май-11	\$12,422,297	\$13,996,199	11.8%	10.5%
Уфимский проезд, вл. 2-10	Юревич Евгений	08-сен-04	22-мар-11	\$16,503,611	\$19,362,984	17.3%	14.7%
Хабаровск-Плаза, строение 3	Бугаенко Алина	01-мар-08	28-мар-09	\$25,392,022	\$25,392,018	40.5%	40.5%

Страница: 1 из 1

Основные параметры портфеля проектов из Primavera Web

Портфель проектов, представленный списком

Девелоперская компания МОНОЛИТ

Пользователь: Евгений Юревич | Мой узел | Мои ссылки

Портфель проектов

Узел: Портфель проектов

Действия узла

Девелоперская компания МОНОЛИТ > Портфель проектов > Производственная программа 2009-2011

Объекты производственной программы 2009-2012

Id	Проект	Старт	Финиш	Финиш по ЦП	Отк. от ЦП	Инд. ЦП	% выполнения	Округ	Рабочее окружение
Руководитель проекта : Алексей Божко (1)									
2	Коттедж на ул.Фрунзенская, 57	11.12.2007 0:00	12.08.2009 9:30	12.08.2009 9:30	0	●	39,66%	ЮАО	http://sp-ent:8080/portfolio/Pages/ProjectWorkspace.aspx?ProjectId=3888&WbsId=3806
Руководитель проекта : Бугаенко Алина (4)									
4	Хабаровск-Плаза, строение 3	01.03.2008 8:00	28.03.2009 14:55	28.03.2009 14:55	-25,86	●	30,71%	БАО	http://sp-ent:8080/portfolio/Pages/ProjectWorkspace.aspx?ProjectId=3878&WbsId=3779
8	Старогородской бульвар, вл. 33	03.08.2004 8:00	02.05.2011 17:00	02.05.2011 17:00	0	●	66,99%	ЮАО	http://sp-ent:8080/portfolio/Pages/ProjectWorkspace.aspx?ProjectId=3858&WbsId=3713
9	Дмитровское шоссе	01.06.2004 0:00	30.06.2009 18:00	30.06.2009 18:00	0	●	55%	ЮАО	http://sp-ent:8080/portfolio/Pages/ProjectWorkspace.aspx?ProjectId=3858&WbsId=3713
7	р-н Марьино вл. 12	30.10.2008 8:00	16.04.2010 17:00	16.04.2010 17:00	0	●	100,87%	ЮАО	http://sp-ent:8080/portfolio/Pages/ProjectWorkspace.aspx?ProjectId=3858&WbsId=3713
Руководитель проекта : Доронина Ирина (2)									
5	Новые Черемушки, 17	01.03.2008 0:00	31.12.2008 16:00	31.12.2008 16:00	0	●	59,67%	ЮАО	http://sp-ent:8080/portfolio/Pages/ProjectWorkspace.aspx?ProjectId=3848&WbsId=3696
3	Проезд Маслова, вл.15-19	18.04.2006 9:00	22.11.2011 16:00	22.11.2011 16:00	-40,88	◆	46,68%	САО	http://sp-ent:8080/portfolio/Pages/ProjectWorkspace.aspx?ProjectId=7138&WbsId=5482
Руководитель проекта : Юревич Евгений (2)									
1	Ленинградский пр-т, 32	01.01.2008 8:00	04.01.2009 16:00	04.01.2009 16:00	-34,99	▲	57,95%	САО	http://sp-ent:8080/portfolio/Pages/ProjectWorkspace.aspx?ProjectId=3858&WbsId=3713
10	Уфимский проезд, вл. 2-10	08.09.2004 8:00	22.03.2011 17:00	22.03.2011 17:00	0	●	67,33%	ЮАО	http://sp-ent:8080/portfolio/Pages/ProjectWorkspace.aspx?ProjectId=7228&WbsId=5735

Основные параметры портфеля проектов из Primavera Web

Ключевые показатели по проектам

Девелоперская компания МОНОЛИТ | Портфель проектов | Пользователь: Евгений Юревич | Мой узел | Мои ссылки | Действия узла

Девелоперская компания МОНОЛИТ | Карта проектов | Портфель проектов | Узел проекта | Узел департамента | Интеграция с Outlook

Девелоперская компания МОНОЛИТ > Портфель проектов > Статистика проектов

Легенда: ✘ Критическая ⚠ Предупреждение ✔ Допустимый ★ Исключение

Портфель проектов	На дату		Прогноз по завершении	
	Расчет расписания	Стоимость	Расчет расписания	Стоимость
Портфель проектов	✘ отстает на 79	✘ \$7,876,793 больше	⚠ отстает на 29	✔ \$5,577,386 больше
Дмитровское шоссе	✘ отстает на 176	✘ \$936,431 больше	✔ по графику	✘ \$1,958,718 больше
Коттедж на ул.Фрунзенская, 57	✔ опережает на 29	✔ \$1,256,002 меньше	✔ по графику	✔ \$1,505,937 меньше
Ленинградский пр-т, 32	✘ отстает на 177	✘ \$5,557,551 больше	⚠ отстает на 35	⚠ \$551,001 больше
Новые Черенушки, 17	✘ отстает на 50	✘ \$1,318,060 больше	✔ по графику	✔ \$140,007 больше
Проезд Маслова, вл.15-19	✘ отстает на 225	✔ \$289,206 меньше	⚠ отстает на 41	✔ \$326 больше
Старогородской бульвар, вл. 33	✔ отстает на 9	★ \$2,315,702 меньше	✔ по графику	✘ \$1,573,902 больше
Уфимский проезд, вл. 2-10	★ опережает на 54	★ \$2,741,904 меньше	✔ по графику	✘ \$2,859,373 больше
Хабаровск-Плаза, строение 3	✘ отстает на 83	✘ \$6,667,568 больше	⚠ отстает на 26	✔ \$5 меньше

Страница: 1 из 1

Ключевые показатели выполнения проектов по портфелю

Интерактивная карта территориального распределения проектов

Девелоперская компания МОНОЛИТ

Узел: Девелоперская компа...

Девелоперская компания МОНОЛИТ **Карта проектов** Портфель проектов Узел проекта Узел департамента Действия узла

Просмотр информации по проекту

Ключевые показатели выполнения по проекту

Документы

- Формы, шаблоны, заявки
- Регламентирующие документы
- Корпоративная отчетность
- connecting

Информация

- Сотрудники и телефоны
- Резервирование переговорной
- Карта проектов**
- Мой табель
- Календарь сотрудников

Общение

- Коллективное обсуждение
- Опрос: портал

Узел проекта

Узел департамента

Портфель проектов

- Статистика проектов
- Состояние проектов
- Проекты по портфелю
- Производственная программа 2009-2011
- Стоимости проектов по ЦП
- Фактическая стоимость по проектам

Легенда: ✘ Критическая ⚠ Предупреждение ✔ Допустимый ★ Исключение

	На дату	
	Расчет расписания	Стоимость
Ленинградский пр-т, 32	✘ отстает на 177	✘ \$5,557,551 больше
Основные объекты строительства	✘ отстает на 196	✘ \$2,580,339 больше
Объекты подсобного и обслуживающего назначения	✘ отстает на 159	✘ \$233,099 больше
Объекты транспортного хозяйства и	-	-

Модуль «Контроль рабочего времени сотрудников»

Контроль времени сотрудников

- Ввод сотрудниками информации по фактическим затратам рабочего времени по видам деятельности (командировкам, отпускам и т.д.)
- Автоматические проверки фактического и указанного времени
- Общеизвестный календарь командировок, отпусков
- Персональный «табель» всегда доступен сотруднику и его руководителю
- Сводный отчет по фактическим затратам рабочего времени за определенный период по сотрудникам с разделением по видам деятельности

Учет времени сотрудников

Табель

Работа в офисе

07.04.2009 12: 34

Примечания:

Пришел

Табель за мес:

Табель

Работа в офисе

Работа в офисе

Болезнь

Командировка выездная

Командировка местная

Отпуск

Личное

Чтение курсов

Пришел

Табель за месяц

Табель

Командировка местная

С:
07.04.2009 09: 00

По:
07.04.2009 19: 00

Примечания:

Отметиться

Табель за месяц

Контроль своего времени каждым сотрудником

Девелоперская компания МОНОЛИТ

Девелоперская компания МОНОЛИТ > Информация > Мой табель

Пришел	Ушел	Итого (ч.)	Примечания
		Сумма = 593,50	
Год, месяц : 2009.03 (Март) (10)			
		Сумма = 112,47	
Тип записи : Командировка выездная (2)			
	06.03.2009 19:00	16,00	
	04.03.2009 19:00	24,00	
		Сумма = 72,47	
	04.03.2009 11:15	8,18	
	04.03.2009 10:00	10,33	
	04.03.2009 9:30	2,63	
	04.03.2009 9:14	8,78	
	03.03.2009 10:30	9,57	
	03.03.2009 10:00	12,95	
	03.03.2009 9:35	10,97	
	02.03.2009 10:00	9,05	
		Сумма = 165,60	
Год, месяц : 2009.02 (Февраль) (23)			
		Сумма = 165,60	
	26.02.2009 9:30	10,93	Из-за курсов не отчитился
	25.02.2009 11:37	8,72	
	25.02.2009 9:20	11,07	
	25.02.2009 9:20	2,77	
	24.02.2009 10:00	10,02	
	24.02.2009 9:36	10,92	
	24.02.2009 9:35	10,93	
	20.02.2009 14:25	4,38	
	20.02.2009 13:30	5,75	
	20.02.2009 10:00	9,08	
	20.02.2009 9:20	9,87	
	19.02.2009 18:00	3,13	
	19.02.2009 10:00	9,00	

Фактические и указанные время прихода, ухода

Суммарные часы по видам работ

Календарное представление

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Сегодня 1 апреля 2009 г.

Просмотреть все содержимое узла

ДОКУМЕНТЫ

- Формы, шаблоны и заявления
- Регламентирующие документы

КАЛЕНДАРИ

- Календарь сотрудников
- Совещания и планеры

СПИСКИ

- Заявки на материалы и оборудование
- Предложения по порталу
- Поручения
- Новости портала ПМСОФТ
- Полезные ссылки

ФОТОГРАФИИ

- Корпоративные мероприятия

ОТДЕЛЫ

- Администрация
- Департамент ПРИТ
- Разработка
- Продажи
- Университет
- Бухгалтерия
- ИТ
- HR

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Проекты
- Сертификация

5 сентября 2009 г. | Пнб | Неделя | Месяц 31

Anastasiya Zheludkova, Отпуск, 07.09.2009 - 20.09.2009					
Elena Balakshiy, Отпуск, 12.09.2009 - 01.10.2009					
Alexandra Gordienko, Отпуск, 12.09.2009 - 01.10.2009					
Stanislav Parmukhin, Отпуск, 12.09.2009 - 01.10.2009					
Alexey Udanov, Отпуск, 31.08.2009 - 16.09.2009					
Nataliya Kozhina, Отпуск, 14.09.2009 - 30.09.2009					
Sergey Mirosnichenko, Командировка, 15.09.2009 - 17.09.2009					
Sergey Sadovnikov, Командировка, 15.09.2009 - 17.09.2009					
Dmitriy Skorobogatov, Болезнь, 15.09.2009 - 16.09.2009					
Inga Kireeva, Учеба, 16.09.2009 - 18.09.2009					

8

9:00	9:00	9:00	9:00	9:50	10:00
Andrey Rossikov, Учеба, 16.09.2009 - 16.09.2009	Julia Dolzhenko, Служебная поездка, 16.09.2009 - 16.09.2009	Anna Nosova, Болезнь, 16.09.2009 - 16.09.2009	Elena Zalem, Личное, 16.09.2009 - 16.09.2009	Igor Saenko, Служебная поездка, 16.09.2009 - 16.09.2009	Sergey Kiselev, Служебная поездка, 16.09.2009 - 16.09.2009

13:30

Elena Aspidova, Личное, 16.09.2009 - 16.09.2009

Живой график командировок и отпусков сотрудников

Сводный отчет занятости персонала

Девелоперская компания МОНОЛИТ

Пользователь: Евгений Юревич | Мой узел | Мои ссылки

Девелоперская компания МОНОЛИТ > Корпоративная отчетность

Корпоративная отчетность

Библиотека с отчетами Reporting Services.

Создать | Отправить | Действия | Параметры

Представление: Текущие отчеты

Тип | Имя | Состояние отчета | Отчет изменен | Владелец | Журнал | Описание отчета

Категория отчета: Отчеты по персоналу

Сотрудник / год.месяц	Работа в офисе	Командировка местная	Командировка выездная	Отпуск	Итого	Итого зачтено
Алина Садукевич	2009.03	32.63			32.63	29.37
	2009.02	180.38			180.38	162.35
	2009.01	98.26		40.00	138.26	124.43
	2008.12				180.12	162.11
	2008.11				156.00	140.40
	2008.10				33.87	30.48
Дмитрий Никифоров	2009.03	23.15	34.00	58.00	113.15	101.84
	2009.02	43.25			43.25	38.93
	2008.10	28.05		32.00	60.05	54.05
Евгений Юревич	2009.03	72.47		40.00	112.47	101.22
	2009.02	165.60			165.60	149.04
	2008.12	172.60			172.60	155.34
Ирина Доронина	2008.11	142.83			142.83	128.55
	2009.03	48.77		32.00	80.77	72.69
	2009.02	46.12			46.12	41.51
Анастасия Митькевич	2009.01	121.70			121.70	109.53
	2009.02	58.90			58.90	53.01
	2008.12	46.90			46.90	42.21
Дмитрий Никифоров	2008.11	17.93			17.93	16.14
	2009.02	49.30		120.00	169.30	152.37
	2009.01	127.40			127.40	114.66
	2008.12	187.20			187.20	168.48
Дмитрий Никифоров	2008.11	70.97		80.00	150.97	135.87
	2008.10	27.07			27.07	24.36

Динамическое отображение отклонений от нормативных значений

Модуль «Аналитическая отчетность»

Аналитическая отчетность

- Аналитическая информация о результатах проектной деятельности организации
- Графические и табличные отчеты, возможность связывать отчеты между собой для организации drill-down отчетности в едином интерфейсе Проектного портала
- Ведение истории сформированных отчетов
- Настройка автоматического формирования и отправки отчетов по электронной почте
- Разграничение права доступа, возможность экспорта отчетов в форматы Microsoft Office, PDF, TIFF

Отчетность

Узел проекта

Девелоперская компания МОНОЛИТ | Карта проектов | Портфель проектов | **Узел проекта** | Узел департамента | Интеграция с Outlook

Список: Отчеты о ходе выпс

Действия узла

Девелоперская компания МОНОЛИТ > Узел проекта > Отчеты о ходе выполнения работ

Отчеты о ходе выполнения работ

Создать | Отправить | Действия | Параметры

Представление: **Все документы**


Тип	Имя	Автор	Дата изменения	Измененный	Размер файла	Статус
	20081202 График и таблица на одном листе (без зависимостей)	Евгений Юревич	05.03.2009 14:10	Евгений Юревич	121 KB	Проверен
	20081208 Структура и функционал КАСУПД	Евгений Юревич	05.03.2009 14:10	Евгений Юревич	1473 KB	Опубликован
	20090205 График и таблица на одном листе (без зависимостей) - вариант 1	Евгений Юревич	05.03.2009 14:10	Евгений Юревич	105 KB	Черновик
	График оставшихся работ	Евгений Юревич	05.03.2009 14:11	Евгений Юревич	109 KB	Окончательный вариант

Ведение архива отчетной информации


Слева: Просмотреть все содержимое узла

- СПИСКИ
 - Совещания и планерки
 - Поручения
 - Контакты
- ДОКУМЕНТЫ
 - Договорная документация
 - Проектно-сметная документация
 - Отчеты о ходе выполнения работ
 - Корреспонденция
- ФОТОГРАФИИ
 - Фотографии с площадок
- Корзина

Графическое отображение показателей по проектам в виде гистограммы

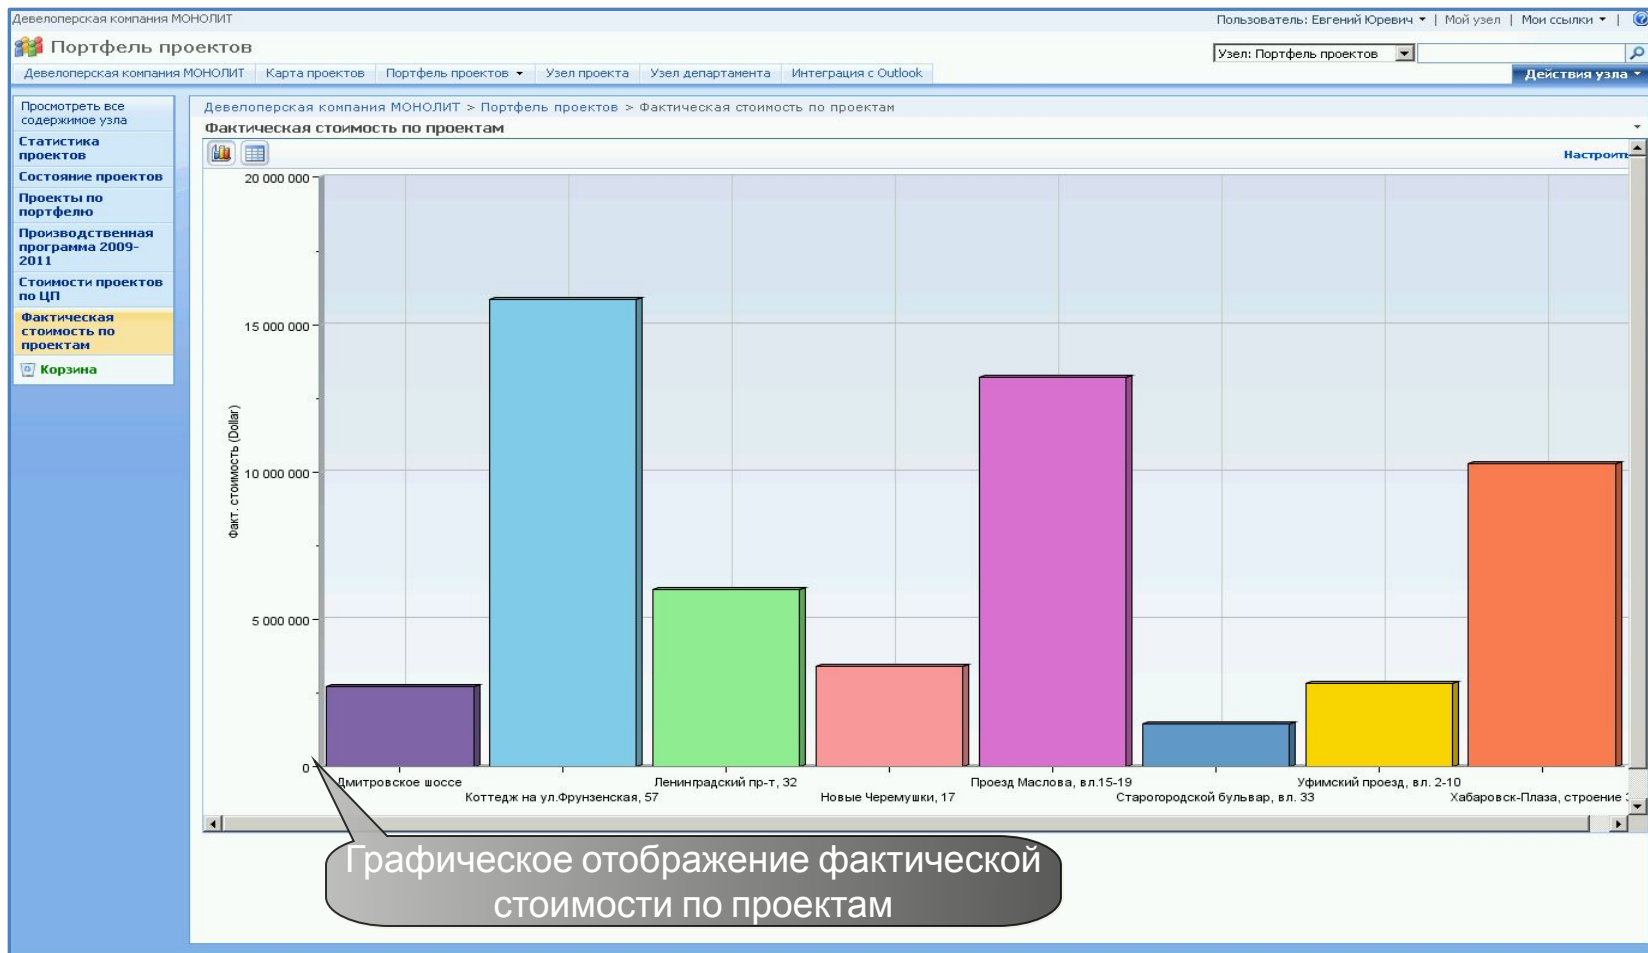

Графическое отображение показателей по проектам в виде круговой диаграммы

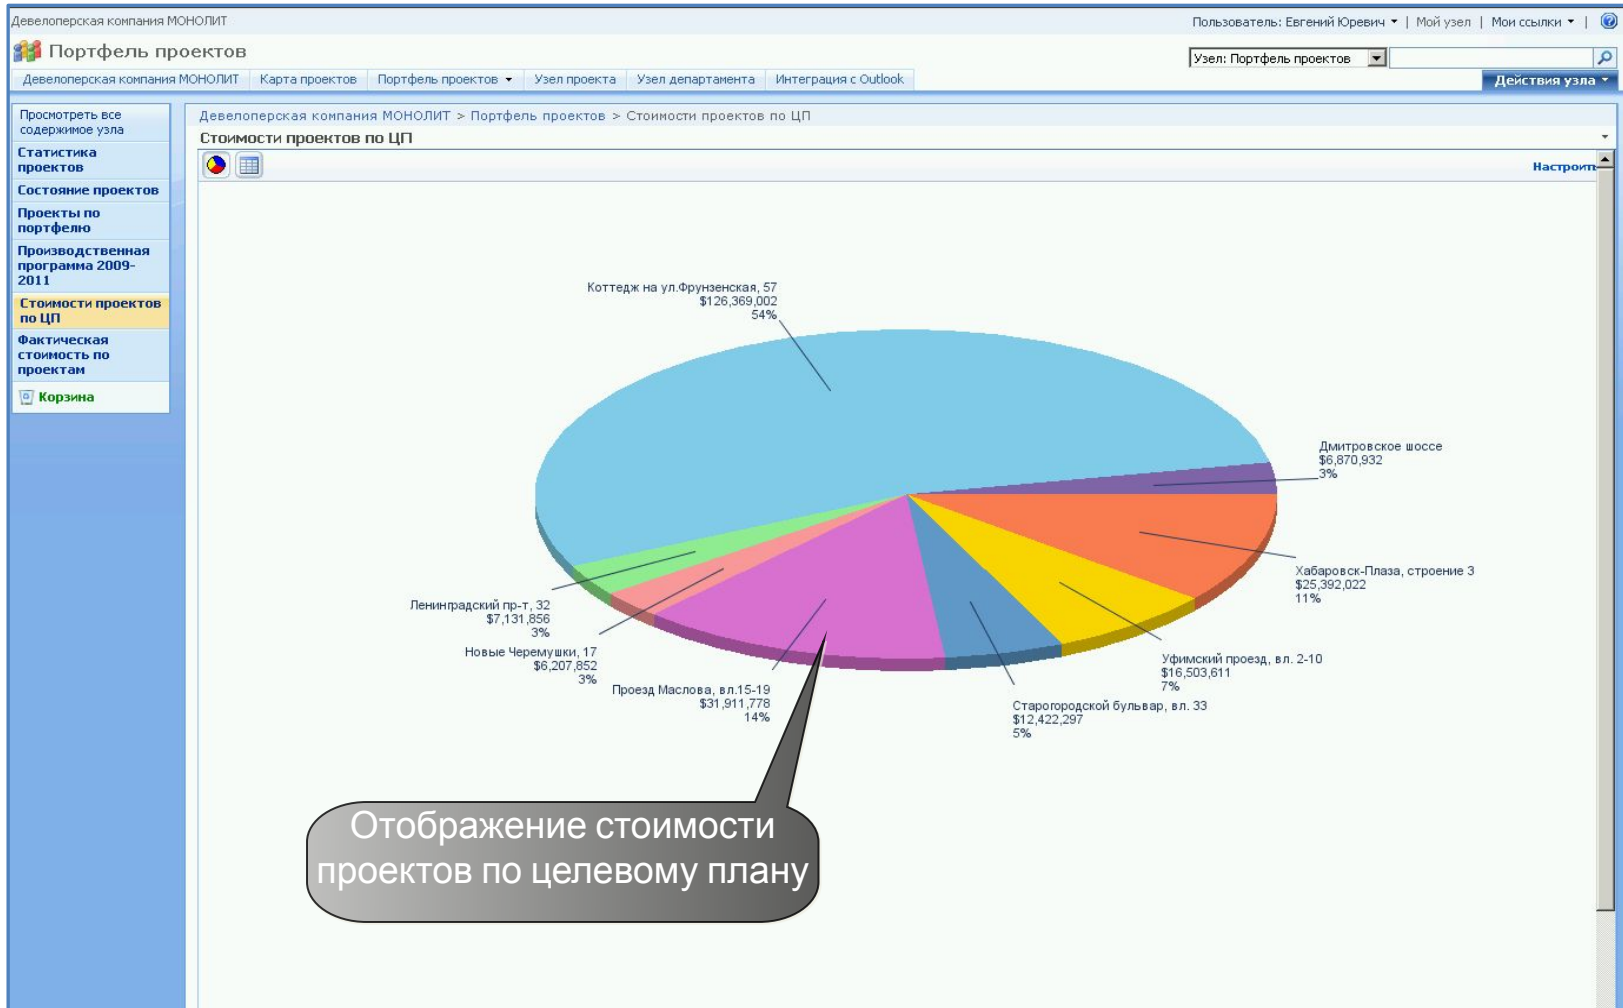

«Информационные сервисы»

Сервисы информационного обмена

Девелоперская компания МОНОЛИТ

Узел: Девелоперская компа...

Девелоперская компания МОНОЛИТ

Карта проектов

Портфель проектов

Узел проекта

Узел департамента

Действия узла

Просмотреть все содержимое узла

Документы

- Формы, шаблоны, заявки
- Регламентирующие документы
- Корпоративная отчетность

Информация

- Сотрудники и телефоны
- Резервирование переговорной
- Карта проектов
- Мой табель
- Календарь сотрудников

Общие

- Коллективное обсуждение
- Опрос: портал

Узел проекта

Узел департамента

Портфель проектов

- Статистика проектов
- Состояние проектов
- Проекты по портфелю
- Производственная программа 2009-2011
- Стоимости проектов по ЦП
- Фактическая стоимость по проектам

Интеграция с Outlook

МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ!

Новости компании

Состоялся круглый стол «Единое информационное пространство для всех участников инвестиционно-строительных проектов» 29.03.2009 14:20
Новое!
от: Евгений Юревич

19 февраля в Москве состоялся круглый стол «Единое информационное пространство для всех участников инвестиционно-строительных проектов: как построить? кто владелец? как поддерживать?». Организатором мероприятия выступила Группа компаний ПМСОФТ, эксклюзивный...

Новый курс обучения «Управление инвестиционными программами» 05.03.2009 12:35
от: Евгений Юревич

Курс предназначен для руководителей высшего и среднего звена управления, руководителей проектов и программ, участников команд проектов. После изучения курса слушатели узнают: характеристики и...

Добавить извещение

Прогноз погоды в Москве

Саратов: День 18 фев, Ср	Саратов: Вечер 18 фев, Ср	Саратов: День 19 фев, Чт	Саратов: Вечер 19 фев, Чт
пасмурно, небольшой снег, температура -1...-3 С, давление 750..752 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 2 м/с	пасмурно, снег, температура -1...-3 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 1 м/с	пасмурно, небольшой снег, температура -1...-3 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 2 м/с	пасмурно, небольшой снег, температура -1...-3 С, давление 752..754 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 2 м/с

Раздел «Новости» на сайте компании

2009-03-13 — Конкурс «Лучший студенческий проект»

2009-03-11 — 19 февраля состоялся круглый стол «Единое информационное пространство для всех участников инвестиционно-строительных проектов»

2009-03-06 — Милые женщины! ГК ПМСОФТ поздравляет Вас с 8 марта!

2009-02-20 — С Днем Защитника Отечества!

2009-01-30 — Новый курс обучения M011 «Управление инвестиционными программами»

2009-01-28 — Университет управления проектами ГК ПМСОФТ внедряет новые формы обучения

2009-01-26 — Юбилейный год компании ПМСОФТ прошел под знаком успеха

Карта сайта

<p>Документы</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Формы, шаблоны, заявки ■ Регламентирующие документы ■ Корпоративная отчетность <p>Информация</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Сотрудники и телефоны 	<p>Узел проекта</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Загрузка ПСД ■ Проектная документация <p>ДОКУМЕНТЫ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Договорная документация ■ Проектная документация 	<p>Портфель проектов</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Статистика проектов ■ Состояние проектов ■ Проекты по портфелю ■ Производственная программа 2009-2011 ■ Стоимости проектов по ЦП ■ Фактическая стоимость по проектам
---	---	---

Учет рабочего времени сотрудников

Работа в офисе

29.03.2009 00: 20

Примечания:

Табель за месяц

Информационные ресурсы

- Структура проектов предприятия
- Узел группы развития SharePoint
- Primavera Timesheets
- Проектно-сметная документация
- Справочник сотрудников
- Добавить ссылку

Поздравляем с днем рождения!

Буванин Александр Алексеевич

Нет фотографии

Новости, прогноз погоды, котировки акций, календари событий и сотрудников

Ведение корпоративных справочников

Девелоперская компания МОНОЛИТ

Девелоперская компания МОНОЛИТ > Сотрудники и телефоны

Сотрудники и телефоны


Представление: **Сотрудники**

ФИО	Кабинет	Телефон	Эл.почта	Должность
Отдел : Руководство (8)				
Колчанов Игорь Витальевич Новое!	236	569803	Kolchanov@monolit.pmssoft.ru	
Коршунов Виталий Николаевич Новое!	200	569806	Korshunov@monolit.pmssoft.ru	
Куликов Николай Анатольевич Новое!	202	569804	Kulikov@monolit.pmssoft.ru	
Николаевский Владимир Владимирович Новое!	305	569805	nvv@monolit.pmssoft.ru	
Ревин Сергей Александрович Новое!	238	569807	revin@monolit.pmssoft.ru	
Самунина Юлия Михайловна Новое!	228	569802	samunina@monolit.pmssoft.ru	Заместитель
Старцев Александр Иванович Новое!	220	569800	starcev@monolit.pmssoft.ru	Начальник управления
Столаров Александр Алексеевич Новое!		569801	Stoljarov@monolit.pmssoft.ru	Главный инженер
Отдел : Учетно-контрольная группа (Факс: 56-22-00, 56-22-21) (8)				
Горшенина Наталья Михайловна Новое!	227	569811	Gorshenina@monolit.pmssoft.ru	Руководитель УКГ
Данильченко Наталья Николаевна Новое!	229	569813	daniilchenko@monolit.pmssoft.ru	Ведущий бухгалтер
Миляева Ольга Владимировна Новое!	228	569812	miljaeva@monolit.pmssoft.ru	Заместитель руководителя группы
Сотникова Ирина Александровна Новое!	231	569818	sotnikova@monolit.pmssoft.ru	Ведущий бухгалтер
Телесникова Лада Васильевна Новое!			Telesnikova@monolit.pmssoft.ru	Бухгалтер
Тимошенко Светлана Сергеевна Новое!	235	569816	Timoshenko55@monolit.pmssoft.ru	Бухгалтер 2 категории
Тимошкина Наталья Витальевна Новое!	231	565361	timoshkina@monolit.pmssoft.ru	Ведущий бухгалтер
Яковлева Ольга Юрьевна Новое!	228	565323	Yakovleva@monolit.pmssoft.ru	Заместитель руководителя группы
Отдел : Геодезический отдел (3)				
Доронина Ирина Александровна Новое!	417	569909	idoronina@monolit.pmssoft.ru	Начальник отдела
Заворин Денис Викторович Новое!		569908	Zavorin@monolit.pmssoft.ru	Геодезист 1 категории
Иско Петр Иосифович Новое!	421	569907	isko@monolit.pmssoft.ru	Заместитель начальника отдела
Отдел : Договорный отдел (Факс: 56-22-69) (5)				
Вальшина Амина Хафизовна Новое!	326	569894	valshina@monolit.pmssoft.ru	Заместитель начальника отдела
Инсапова Ирина Халитовна Новое!	328	569893	loginova@monolit.pmssoft.ru	Инженер 2 категории
Литвинова Светлана Борисовна Новое!	326	569896	litvinovasb@monolit.pmssoft.ru	Инженер 1 категории
Феофанова Александра Александровна Новое!	326	569895	feofanova@monolit.pmssoft.ru	Ведущий инженер


Настраиваемые представления: группировка, сортировка, фильтры и состав данных (колонки)

Техническая архитектура и основные преимущества платформы SharePoint

Техническая архитектура

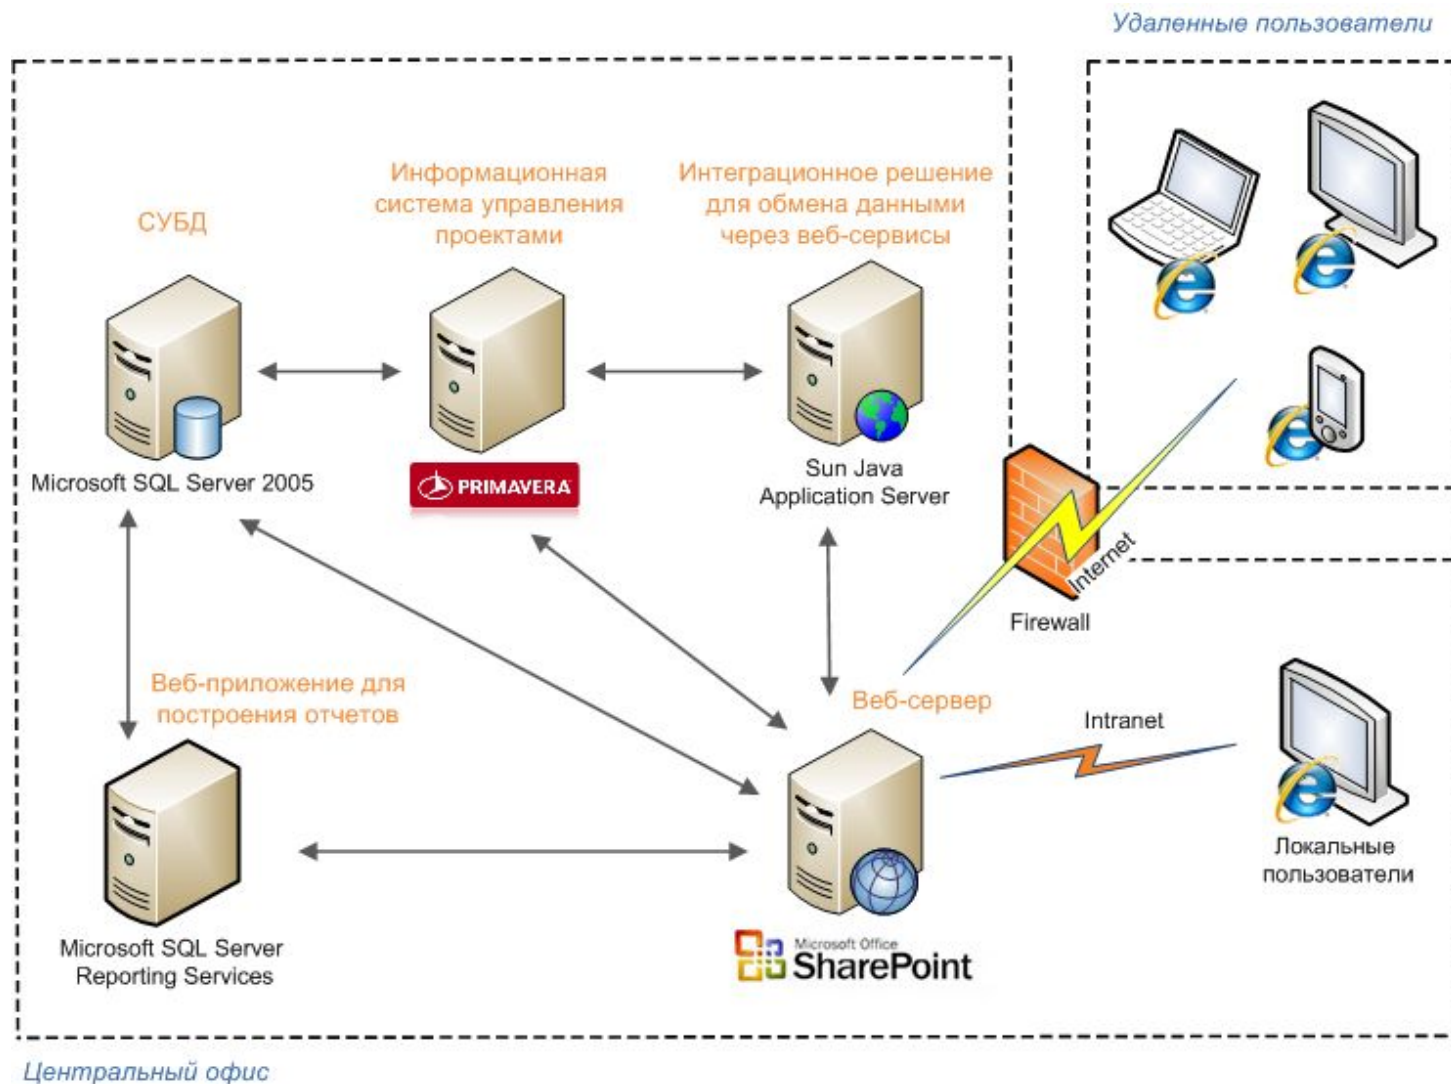


Квадрат Gartner по порталным решениям

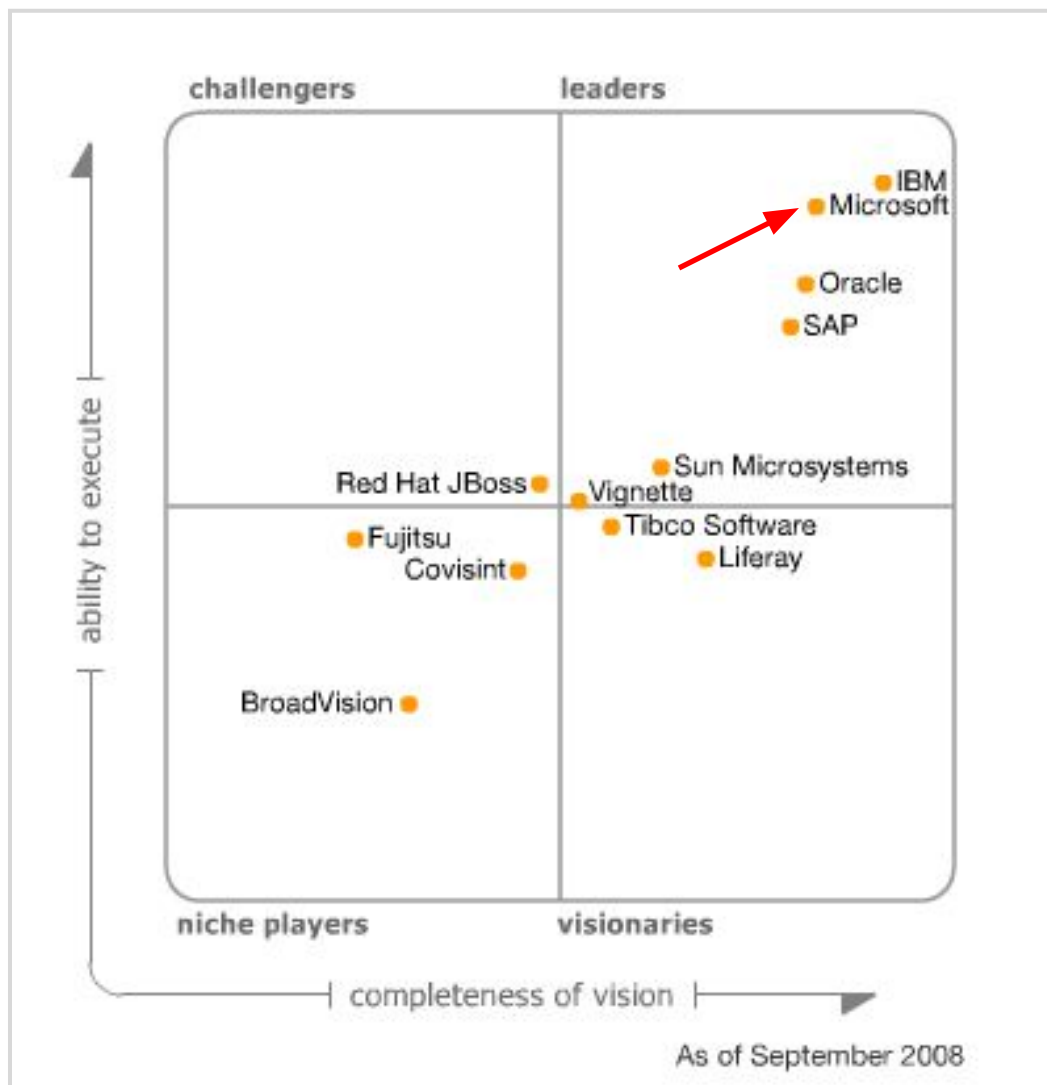

Почему Microsoft SharePoint?

- Полная интеграция с Microsoft Office (почта, календари, документы, таблицы, оповещения)
- Масштабируемость решений – функциональная, программная и аппаратная
- Широкий набор готовых web-компонентов и шаблонов — возможности быстрого развертывания портала
- Оптимальное соотношение цена/качество, низкая стоимость владения
- Интеграция с бизнес-приложениями, web-ресурсами, корпоративными БД

Выгоды от внедрения

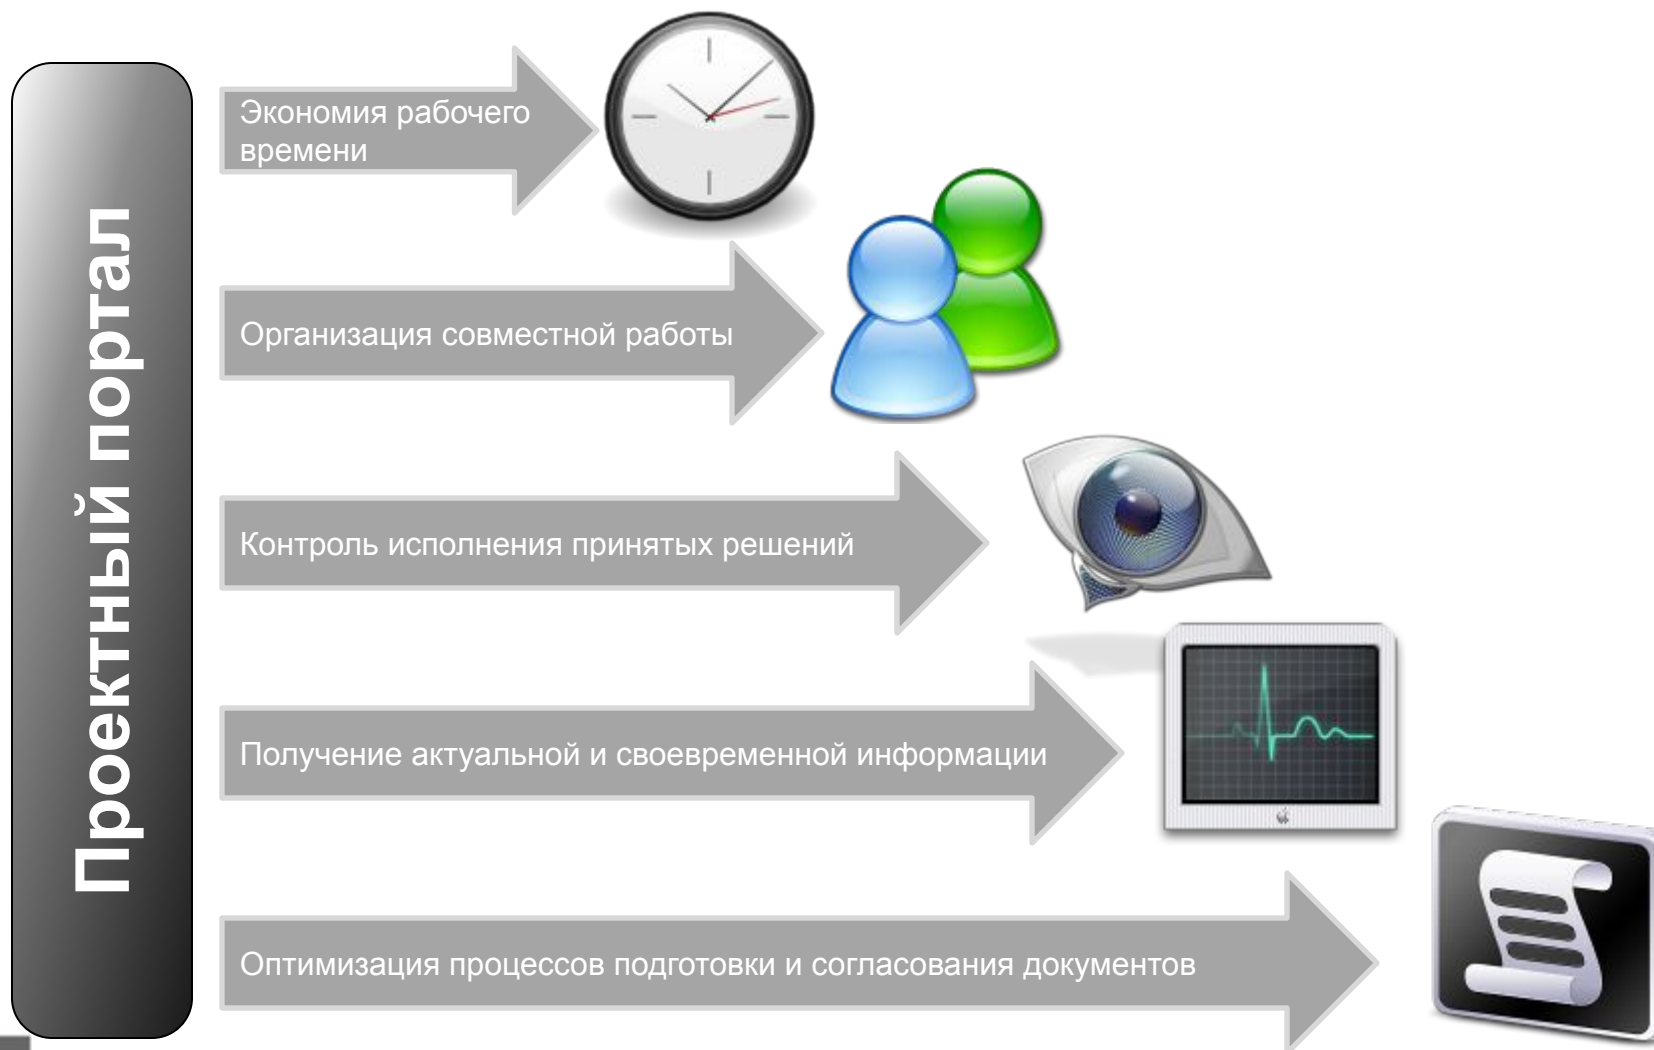


Выгоды от внедрения

Бесперебойный доступ

Разграничение прав и полномочий

Актуальная информация

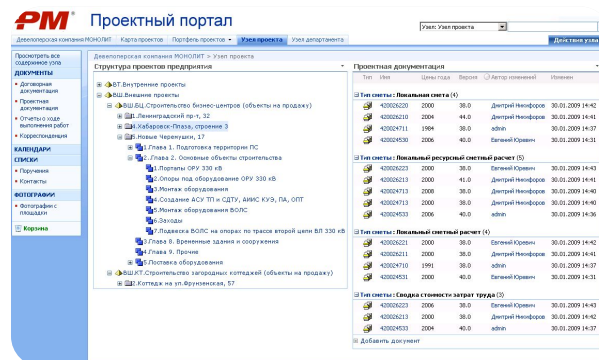

ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ

Единый интерфейс

Своевременные решения

Спасибо за Внимание!

Группа компаний ПМСОФТ

тел. +7 (495) 232-1100

факс +7 (495) 238-1098

sales@pmsoft.ru

www.pmsoft.ru



Information Worker Solutions

