



Система управления проектами. Опыт разработки и внедрения


Юрий Шиляев
директор Artics-Минск

- **Введение**

Зачем нам система управления проектами?

*Очевидно, что она нужна всем подобным
компаниям!*

• Что было раньше


ЗАДАЧЕСКИЙ МЕНЕДЖЕР V.0.2

Сообщение :: [Настройки](#) :: [Новость](#) :: [Сотрудники](#) :: [Проекты](#) :: [Отчеты](#) :: [Компания](#)
Отправленные :: [Полученные](#) :: [Контролируемые](#) :: [Выполненные](#) :: [Подтверждения](#) :: [Создать](#)

График работы:

На месте

- [Уйти на перерыв](#)
- [Закончить раб. день](#)

Сообщения:

28.09.2006 - Мона Лиза?
Курьянов И. - Нуно, Леонардо!

27.09.2006 Юра, скажи мне информацию о том, кому и что ты должен из функционала и какой срок у тебя сейчас есть

27.09.2006 Юра, а что проект делать по плану на Турфранс на сайт?

27.09.2006 Привет, Юра

[создать сообщение](#) [архив](#) [архив уведомлений](#)

Новости компании:

10.08.2006 Специально для тех, кто знал, но забыл или забыл, но когда-то знал...
[Подробнее...](#)

07.06.2006 Итоги работы компании за последнее время
[Подробнее...](#)

Контролируемые задания:

исполнитель	проект	задание	deadline	ком.	приоритет	готовность
Иванов И.	TMS2	Модуль взаимодействия с клиентом	15.09.2006 15:15	-	4	готово
Петров А.	Турфранс	Доработки шаблонов модуля каталог	22.09.2006 17:30	есть	4	-
Иванов И.	artics	Ознакомление со стандартами	21.02.2006 13:30	-	3	готово
Петров А.	Турфранс	верстка макета главной	02.10.2006 20:00	есть	3	-
Иванов И.	TMS2	tms2 - начало жизни	26.09.2006 15:45	есть	3	готово

[подробнее](#) [создать задание](#) [архив](#)

Полученные задания:

проект	задание	контролёр	deadline	ком.	приоритет
TMS2	вопросы и предложения	-	06.10.2006 14:45	есть	4
Турфранс	Консультирование и поддержка сайта	-	24.03.2006 16:15	-	2
Семинары	Семинары и дискуссии	-	21.03.2006 17:45	-	1

[подробнее](#) [создать задание](#) [архив](#)

Отправленные задания:

исполнитель	проект	задание	deadline	ком.	приоритет
Петров А.	Турфранс	Наполнить сайт тестовой информацией	23.06.2006 18:00	есть	4
Иванов И.	Турфранс	Модуль "Пользователи"	17.08.2006 17:15	-	4

- Какая нам нужна система управления проектами?
 - У компании 2 офиса. Питер и Минск.
 - Заказчики в разных странах.
 - Средние проекты (до 1 человеко-года) с большой декомпозицией задач.
 - Проекты на поддержке и в разработке.
 - Взаимодействие с субподрядчиками.

Нам нужна система, которая позволила бы не только управлять проектами, но и дать возможность общаться проектной команде.

• Почему не MS Project?

- 2 сервера под WIN по одному на каждый офис.
*Не менее **\$2000***
- Покупка лицензии. **\$1500** за сервер + **\$900** за рабочую станцию.
- Привлечение консультантов. *От **\$25** в час.*
- Перестройка работы всей компании. **\$???**
- ***Сложность гибкой настройки под нужды компании.***

Убедительные аргументы?

- **Подход компании Artics к разработке**
 - Постановка целей и задач.
 - Сбор требований от будущих пользователей.
 - Проектирование, написание ТЗ.
 - Проектирование интерфейса и при необходимости создание html-прототипа.
 - Тестирование интерфейса и прототипа. Внесение изменений в ТЗ.
 - Разработка. Итерационный подход, разбивая проект по этапам.
 - Тестирование и сдача в эксплуатацию.

• Постановка задачи

- Основная функциональность по управлению проектами и задачами.
- Поддержка производственных и административных процессов компании.
- Time tracking задач + учет времени работы.
- Bug tracking.
- Коммуникации по проектам и общим вопросам.
- Накопление статистики по проектам с последующим ее анализом.

• Проектирование


- Функции системы.
- Объекты системы.
- Пользователи системы.

Получаем ТЗ.


- Первичное проектирование интерфейса.
- **Прототип системы.**

Прототип – важный этап в разработке подобной программы. Он позволил вывести обсуждение системы на общекорпоративный уровень.

• Объекты системы

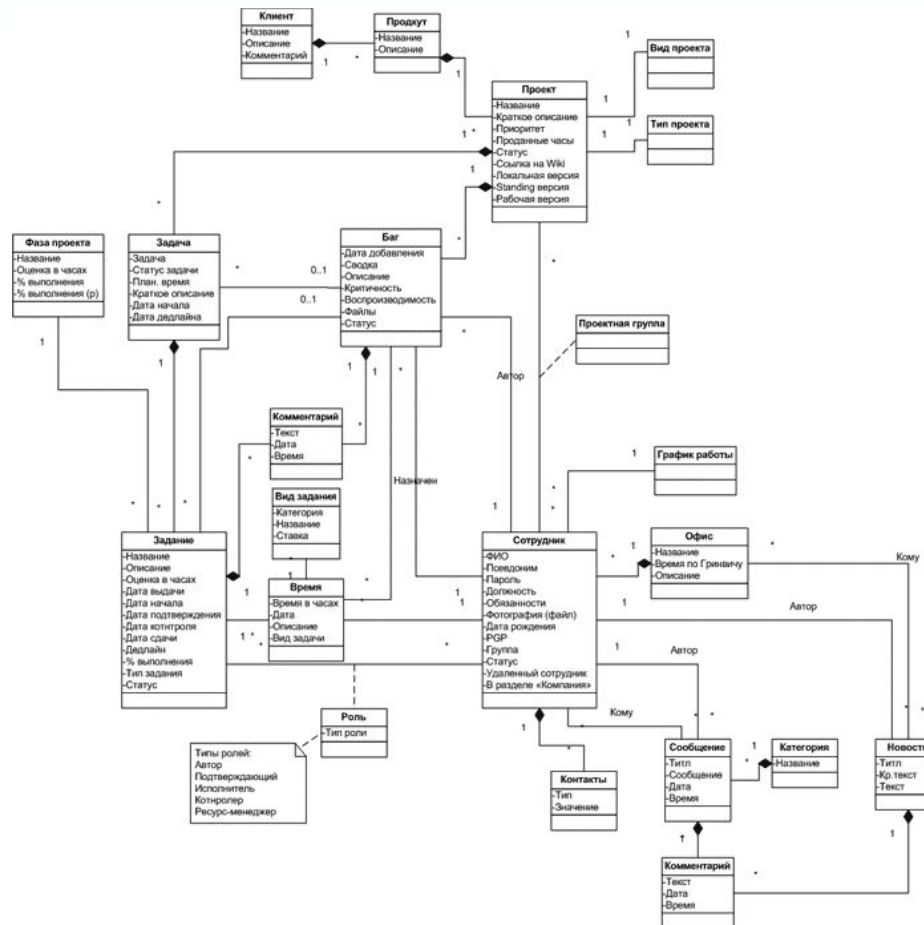

Прототип системы



ЗАДАНИЕСКИЙ
МЕНЕДЖЕР V.0.2

Компания
[Новости](#)

Yuri Shilyaev | Выход
3 Новых | Написать сообщение
На работе | Уйти на перерыв | Домой!!

Dashboard

Задания

Баги

Время

Журнал

Сотрудники

Проекты

Копит

Отчеты

! Внимание

1 дн. до	Сверстать чо-нить	– Ваше задание
1 дн. до	Сверстать чо-нить	– Задание от Данковцев Е.

Активные задания

2 дня до	Сверстать что-нибудь и так далее	Собственный проект	1%
2 дня до	Сверстать что-нибудь и так далее	Собственный проект	1%
2 дня до	Сверстать что-нибудь и так далее	Собственный проект	1%
2 дня до	Сверстать что-нибудь и так далее	Собственный проект	1%

Проекты: [Project1](#), [Project2](#), [Project3](#)

Задания на контроле

2 дня до	Сверстать что-нибудь и так далее	Собственный проект	1%
2 дня до	Сверстать что-нибудь и так далее	Собственный проект	1%

Проекты: [Project1](#), [Project2](#), [Project3](#)

Проекты

Project1 [Редактировать](#) | [План проекта](#)

Задачи	Deadline	%	Статус	Время(план/факт)
Съездить куда-нить на рыбалку, расслабиться, попить пива	9 мая	1%	В работе	23/20
Съездить куда-нить на рыбалку, расслабиться, попить пива	9 мая	1%	В работе	12/21

График работы

Отсутствует!

Прийти на работу!

Сообщения

Коммент	21 мая	Там, сделай то, это, и это тоже. Работай, короче...	От Yuri Shilyaev
* Коммент	21 мая	Там, сделай то, это, и это тоже. Работай, короче...	От Yuri Shilyaev
Коммент	21 мая	Там, сделай то, это, и это тоже. Работай, короче...	От Yuri Shilyaev
* Коммент	21 мая	Там, сделай то, это, и это тоже. Работай, короче...	От Yuri Shilyaev
* Коммент	21 мая	Там, сделай то, это, и это тоже. Работай, короче...	От Yuri Shilyaev
Сообщение	21 мая	Там, сделай то, это, и это тоже. Работай, короче...	От Yuri Shilyaev
Коммент	21 мая	Там, сделай то, это, и это тоже. Работай, короче...	От Yuri Shilyaev
Сообщение	21 мая	Там, сделай то, это, и это тоже. Работай, короче...	От Yuri Shilyaev
Сообщение	21 мая	Там, сделай то, это, и это тоже. Работай, короче...	От Yuri Shilyaev

[Все сообщения за сегодня](#)
[Архив](#)

Новости

Сегодня в городе Кобрине была зафиксирована самая низкая температура за апрель за всю историю существования города Кобрина – **12.04.2006**
[Подробнее...](#)

Сегодня в городе Кобрине была зафиксирована самая низкая температура за апрель за всю историю существования города Кобрина – **12.04.2006**

- Писать «с нуля» или взять основу?

Open source:

- dotProject.
- NetOffice (+ модификации)


*По сумме параметров была выбрана система
NetOffice (netoffice.sf.net).*

• Проектирование интерфейса

- Анализ текущего интерфейса системы.
- Проектирование wireframes.
- Дизайн интерфейса (субподряд).
- ... верстка и внедрение интерфейса в систему.

NetOffice не обладает выдающимся интерфейсом и, к сожалению, в виду технологического решения не будет. Но мы сделали его значительно лучше.

• Интерфейс NetOffice

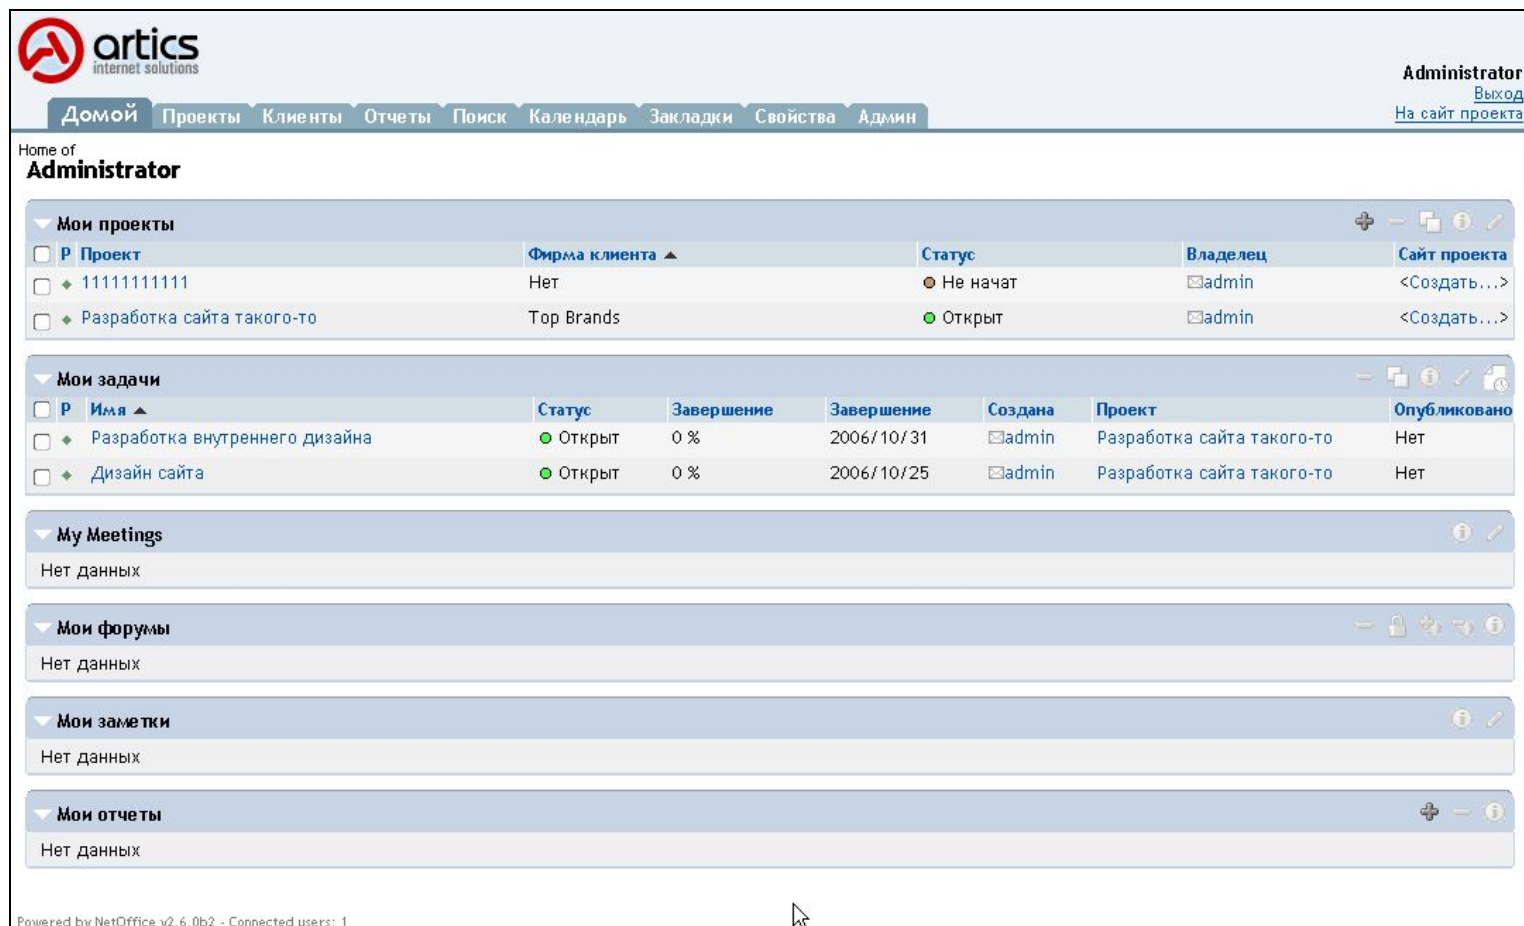

The screenshot displays the NetOffice web interface for an administrator. The interface includes a navigation menu with options like 'Домой', 'Проекты', 'Клиенты', 'Отчеты', 'Поиск', 'Календарь', 'Закладки', 'Свойства', and 'Админ'. The user is logged in as 'Administrator' with a 'Выход' (Logout) link and a link to 'На сайт проекта'.

The main content area is titled 'Home of Administrator' and contains several sections:


- Мои проекты (My Projects):** A table listing projects with columns for 'Проект', 'Фирма клиента', 'Статус', 'Владелец', and 'Сайт проекта'.

Проект	Фирма клиента	Статус	Владелец	Сайт проекта
111111111111	Нет	● Не начат	admin	<Создать...>
Разработка сайта такого-то	Top Brands	● Открыт	admin	<Создать...>
- Мои задачи (My Tasks):** A table listing tasks with columns for 'Имя', 'Статус', 'Завершение', 'Завершение', 'Создана', 'Проект', and 'Опубликовано'.

Имя	Статус	Завершение	Завершение	Создана	Проект	Опубликовано
Разработка внутреннего дизайна	● Открыт	0 %	2006/10/31	admin	Разработка сайта такого-то	Нет
Дизайн сайта	● Открыт	0 %	2006/10/25	admin	Разработка сайта такого-то	Нет
- My Meetings:** Shows 'Нет данных' (No data).
- Мои форумы (My Forums):** Shows 'Нет данных' (No data).
- Мои заметки (My Notes):** Shows 'Нет данных' (No data).
- Мои отчеты (My Reports):** Shows 'Нет данных' (No data).

At the bottom of the interface, it states 'Powered by NetOffice v2.6.0b2 - Connected users: 1'.

• WireFrames



Шилев Юрий | 5 новых | Сообщение! | Выход

Статус: ● На работе | На перерыв | Доной

Домой | Задачи | Баги | Время за день | Журнал

Проекты | Клиенты | Сотрудники | Отчеты | Календарь

[Глав. страница >](#)

Внимание! Проверьте очереди или кратно просроченные задачи!

- 18.06.2006 Верстка дизайна стартовой страницы (Данковцев Евгений, быстро, Разработка проекта TMS2)
- 18.06.2006 Верстка дизайна стартовой страницы (Данковцев Евгений, быстро, Разработка проекта TMS2)
- 18.06.2006 Верстка дизайна стартовой страницы (Данковцев Евгений, быстро, Разработка проекта TMS2)

Мои задачи

Deadline	Название	Проект	Приоритет	Статус	%
18.06.06	Верстка дизайна стартовой страницы	TMS2	Быстро	Открыт	20%
18.06.06	Верстка дизайна стартовой страницы	TMS2	Быстро	Открыт	20%
18.06.06	Верстка дизайна стартовой страницы	TMS2	Быстро	Открыт	20%
18.06.06	Верстка дизайна стартовой страницы	TMS2	Быстро	Открыт	20%
18.06.06	Верстка дизайна стартовой страницы	TMS2	Быстро	Открыт	20%
18.06.06	Верстка дизайна стартовой страницы	TMS2	Быстро	Открыт	20%
18.06.06	Верстка дизайна стартовой страницы	TMS2	Быстро	Открыт	20%

Поставленные задания

Deadline	Название	Исполнитель	Проект	Приоритет	Статус	%
18.06.06	Верстка дизайна стартовой страницы	meleshko	TMS2	Быстро	Открыт	20%
18.06.06	Верстка дизайна стартовой страницы	meleshko	TMS2	Быстро	Открыт	20%
18.06.06	Верстка дизайна стартовой страницы	meleshko	TMS2	Быстро	Открыт	20%
18.06.06	Верстка дизайна стартовой страницы	meleshko	TMS2	Быстро	Открыт	20%
18.06.06	Верстка дизайна стартовой страницы	meleshko	TMS2	Быстро	Открыт	20%
18.06.06	Верстка дизайна стартовой страницы	meleshko	TMS2	Быстро	Открыт	20%

Мои проекты

Deadline	Название	Владелец	Фирма	Приоритет	Статус	%
18.06.06	TMS 2	parshin	TMS2	Быстро	Открыт	20%
18.06.06	TMS 2	parshin	TMS2	Быстро	Открыт	20%
18.06.06	TMS 2	parshin	TMS2	Быстро	Открыт	20%
18.06.06	TMS 2	parshin	TMS2	Быстро	Открыт	20%
18.06.06	TMS 2	parshin	TMS2	Быстро	Открыт	20%
18.06.06	TMS 2	parshin	TMS2	Быстро	Открыт	20%

Мои форумы

Мои митинги

Мои отчеты

График работы

! Отсутствует на работе

✔ Принят!

Сообщения

сообщение Данковцев: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam interdum. Donec accumsan, vehicula orci, eget consectetur neque tortor id ante.

сообщение Данковцев: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam interdum. Donec accumsan, purus ut viverra pharetra, augue tellus vehicula orci, eget consectetur neque tortor id ante.

сообщение Данковцев: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam interdum. Donec accumsan, purus ut viverra pharetra, augue tellus vehicula orci, eget consectetur neque tortor id ante.

сообщение Данковцев: Верстка стартовой страницы сайта.

[Все сообщения](#)

Новости

4.31.10.06 [Итоги работы компании за квартал](#) | [Детали](#)

4.31.10.06 В недрах компании Artics идет полная работа над Artics CMS 2.0.

4.31.10.06 Сотрудник нашей компании Петр Макаров приобрел статус отпа. Так держаться!

[Все новости](#)

ПОИСК

TMS2

Стартовая страница


Cr. Date: 23-Mar-06
Mod. Date: 14-Jun-06
Page 1 of 1

Filename: TMS Wireframe Template.vsd

[Правила использования](#) |
 [Справка](#)

Разработано в Artics Internet Solutions
 на основе [NetOffice](#)

• Дизайн системы

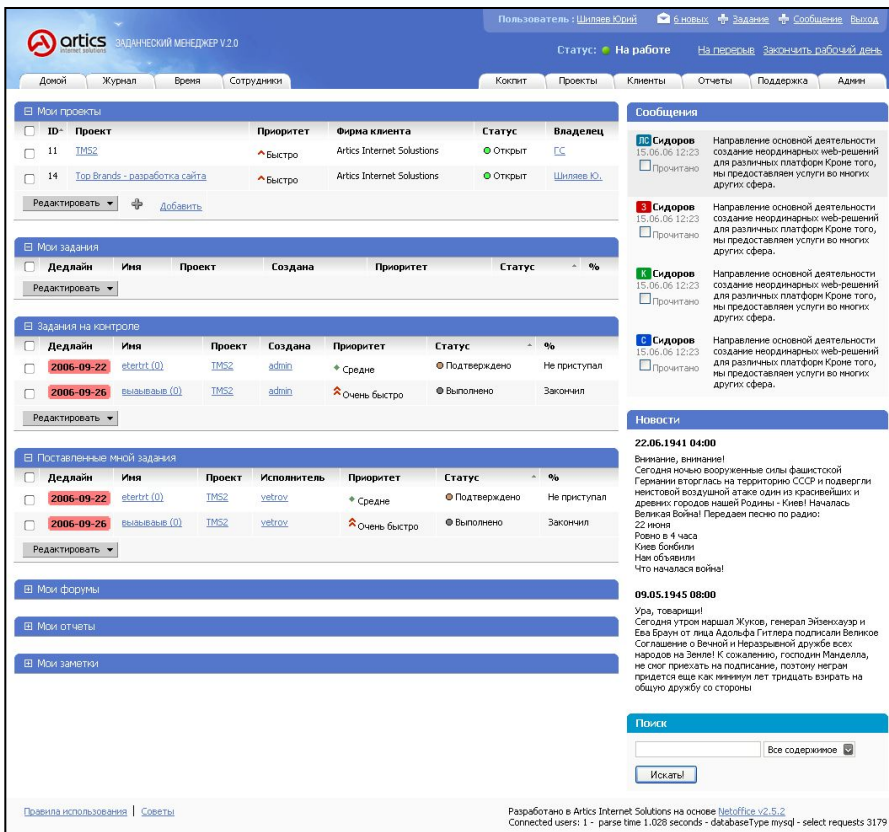

Пользователь: Шилев Юрий | Статус: На работе

Мои проекты

ID	Проект	Приоритет	Фирма клиента	Статус	Владелец
11	TMS2	Быстро	Artics Internet Solutions	Открыт	ЮС
14	Top Brands - разработка сайта	Быстро	Artics Internet Solutions	Открыт	Шилев Ю.

Мои задания

Дедлайн	Имя	Проект	Создана	Приоритет	Статус	%
2006-09-22	etefrt(0)	TMS2	admin	Средне	Подтверждено	Не приступал
2006-09-26	выльваев(0)	TMS2	admin	Очень быстро	Выполнено	Закончил

Поставленные мной задания

Дедлайн	Имя	Проект	Исполнитель	Приоритет	Статус	%
2006-09-22	etefrt(0)	TMS2	vetov	Средне	Подтверждено	Не приступал
2006-09-26	выльваев(0)	TMS2	vetov	Очень быстро	Выполнено	Закончил

Мои форумы

Мои отчеты

Мои заметки


22.06.1941 04:00
Вензана, внимание!
Сегодня ночью вооруженные отряды фашистской Германии вторглись на территорию СССР и подвергли неустойчивой воздушной атаке один из красивейших и древних городов нашей Родины - Киев! Началась Великая Война! Передаем песню по радио:
22 июня
Ровно в 4 часа
Киев бомбили
Нан обильные
Что началось война!

09.05.1945 08:00
Ура, товарищи!
Сегодня утром маршал Жуков, генерал Эйзенхауэр и Ево Бразун от лица Адольфа Гитлера подписали Великое Соглашение о Вечной и Неразрывной дружбе всех народов на Земле! К сожалению, господин Манделла, не смог приехать на подписание, поэтому негрит придется еще как минимум лет тридцать выжить на общую дружбу со стороны

Поиск

Искать

Разработано в Artics Internet Solutions на основе netoffice v2.5.2
Connected users: 1 - parse time 1.028 seconds - databaseType mysql - select requests 3179

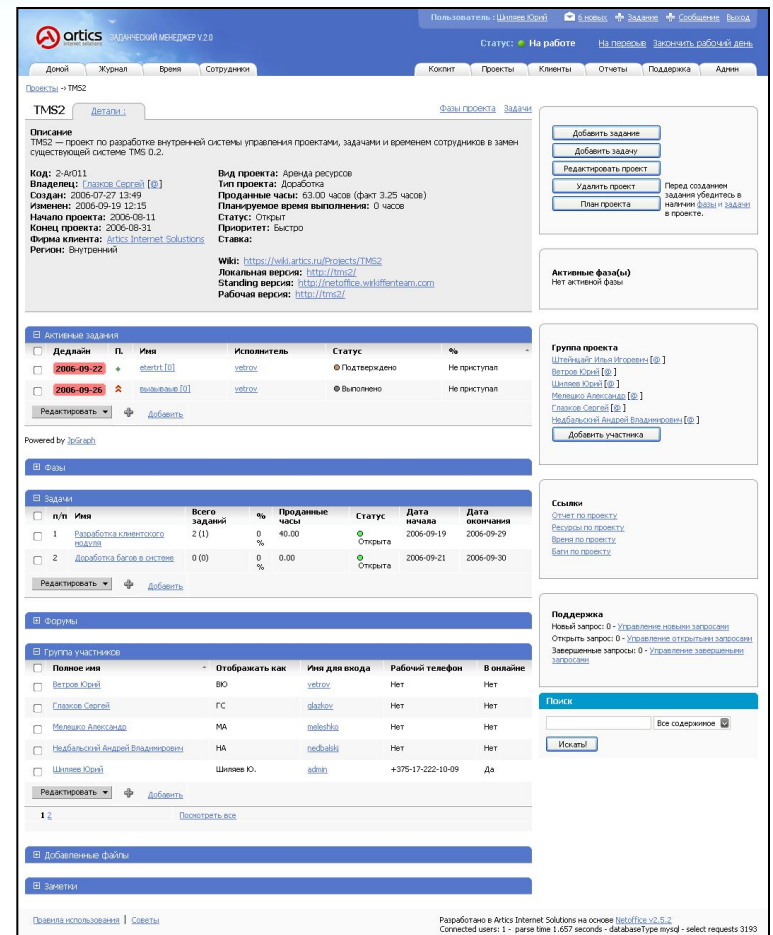

Пользователь: Шилев Юрий | Статус: На работе

Проекты → TMS2

Описание
TMS2 - проект по разработке внутренней системы управления проектами, задачами и временем сотрудников в замен существующей системы TMS 0.2.

Мод: 2.4.0.11
Владелец: Глазков Сергей [Ю]
Создан: 2006-07-27 13:49
Изменен: 2006-09-19 12:15
Начало проекта: 2006-08-11
Конец проекта: 2006-08-31
Фирма клиента: Artics Internet Solutions
Решение: Внутреннее

Вид проекта: Аренда ресурсов
Тип проекта: Доработка
Продаваемые часы: 63.00 часов (факт 3.25 часов)
Планируемое время выполнения: 0 часов
Статус: Открыт
Приоритет: Быстро
Ставка:

Wiki: <https://wiki.artics.ru/Projects/TMS2>
Локальная версия: <https://tms2/>
Standalone версия: <http://redoffice.wikiartics.com>
Рабочая версия: <http://tms2/>

Активные задачи

Дедлайн	Имя	Исполнитель	Статус	%
2006-09-22	etefrt(0)	vetov	Подтверждено	Не приступал
2006-09-26	выльваев(0)	vetov	Выполнено	Не приступал

Группа проекта
Шилев Юрий [Ю] [Ю]
Ветов Юрий [Ю]
Шилев Юрий [Ю]
Мельничко Александр [Ю]
Глазков Сергей [Ю]
Набальский Андрей Владимирович [Ю]

Ссылки
Счет по проекту
Ресурсы по проекту
Время по проекту
Батт по проекту

Поддержка
Новый запрос: 0 - управление новыми запросами
Открыть запрос: 0 - управление открытыми запросами
Закрепленные запросы: 0 - управление закрепленными запросами

Поиск

Искать

Разработано в Artics Internet Solutions на основе netoffice v2.5.2
Connected users: 1 - parse time 1.667 seconds - databaseType mysql - select requests 3193

• Процесс разработки

- Описали изменения к NetOffice.
- Внесли изменения в ТЗ (ТЗ №2).
- Описали новые модули.
- Выделили первичную функциональность (Этап 1).
- Наняли программиста.

Система УПП внутренний проект, и потому решено было разрабатывать его в итерационной модели взаимодействия с разработчиком.


• Первичная функциональность

- Управление объектами системы (клиент, проект, фаза, задача, задание, время, файлы).
- План проекта.
- Управление сотрудниками.
- График работы.
- Отчеты о графике работы и затраченном времени.
- «Нотификаторы».



Опыт разработки системы управления проектами Artics Internet Solutions

- Несколько скриншотов



ЗАНЯТОСТИ
artics internet solutions

Пользователь : Шляев Юрий ✉ 6 новых ✚ Задание ✚ Сообщение Выход

Статус: ● На работе
[На перерыв](#)
[Закончить рабочий день](#)

Домой
Журнал
Время
Сотрудники

Копит
Проекты
Клиенты
Отчеты
Поддержка
Админ

Мои проекты

<input type="checkbox"/>	ID*	Проект	Приоритет	Фирма клиента	Статус	Владелец
<input type="checkbox"/>	11	TMS2	↑ Быстро	Artics Internet Solutions	● Открыт	ГС
<input type="checkbox"/>	14	...	↑ Быстро	Artics Internet Solutions	● Открыт	Шляев Ю.

Редактировать ▾ ✚ [Добавить](#)

Мои задания

<input type="checkbox"/>	Дедлайн	Имя	Проект	Создана	Приоритет	Статус	%
<input type="checkbox"/>							

Редактировать ▾

Задания на контроле

<input type="checkbox"/>	Дедлайн	Имя	Проект	Создана	Приоритет	Статус	%
<input type="checkbox"/>	2006-09-22	etertrt (0)	TMS2	admin	◆ Средне	● Подтверждено	Не приступал
<input type="checkbox"/>	2006-09-26	выывывыв (0)	TMS2	admin	↑ Очень быстро	● Выполнено	Закончил

Редактировать ▾

Поставленные мной задания

<input type="checkbox"/>	Дедлайн	Имя	Проект	Исполнитель	Приоритет	Статус	%
<input type="checkbox"/>	2006-09-22	etertrt (0)	TMS2	vetrov	◆ Средне	● Подтверждено	Не приступал
<input type="checkbox"/>	2006-09-26	выывывыв (0)	TMS2	vetrov	↑ Очень быстро	● Выполнено	Закончил

Редактировать ▾

Сообщения

ЛС

Сидоров
 15.06.06 12:23
 Прочитано

Направление основной деятельности создание неординарных web-решений для различных платформ Кроме того, мы предоставляем услуги во многих других сфера.

З

Сидоров
 15.06.06 12:23
 Прочитано

Направление основной деятельности создание неординарных web-решений для различных платформ Кроме того, мы предоставляем услуги во многих других сфера.

К

Сидоров
 15.06.06 12:23
 Прочитано

Направление основной деятельности создание неординарных web-решений для различных платформ Кроме того, мы предоставляем услуги во многих других сфера.

С

Сидоров
 15.06.06 12:23
 Прочитано

Направление основной деятельности создание неординарных web-решений для различных платформ Кроме того, мы предоставляем услуги во многих других сфера.

Новости

22.06.1941 04:00

Внимание, внимание!
 Сегодня ночью вооруженные силы фашистской Германии вторглась на территорию СССР и подвергли неустойкой воздушной атаке один из красивейших и древних городов нашей Родины - Киев! Началась Великая Война! Передаем песню по радио:
 22 июня
 Ровно в 4 часа
 Киев бомбили
 Нам объявили
 Что началась война!

Пользователь : Шляев Юрий Александрович 6 новых + Задание + Сообщение Выход
artics internet solutions ЗАДАЧНИККИЙ МЕНЕДЖЕР V.2.0
Статус: ● На работе На перерыв Закончить рабочий день

Домой
Журнал
Время
Сотрудники
Кокпит
Проекты
Клиенты
Отчеты
Поддержка
Админ

Проекты -> -> Пошить 70 валенок

Пошить 70 валенок
Детали

Описание
Сделать согласно ТЗ

Исполнитель: Шляев Юрий Александрович [@]
Подтверждающий: Не подписан
Контролер: Не подписан
Ресурс-менеджер: Владимир Новик [@]

Завершение: Середина работы Ok

Время выполнения: 40 часов
Актуально по времени: 23.9 часов

Выполнить до: 2006-08-31
Создан: 2006-07-24 11:29
Подписан: 2006-07-27 12:23
Дата подтверждение: 2006-07-27 12:23
Дата начала работы: 2006-08-17 12:47
Дата изменения: 2006-08-17 11:53
Тип: Разработка
Статус: ● В работе
Приоритет: ▲ Средне

Время
Отложено
Выполнено

Удалить
Правка

Проект:
Фаза:
Задача: Делать валенки
Фирма клиента:

Группа проекта Добавить участника

Поиск

Все содержимое ▾

Искать!

Комментарии [2]

2006-09-08 18:01:23 Шляев Юрий Александрович [@] Удалить ✕

This is the frontpage of the K2 archives. Currently the archives are spanning 24 posts and 346 comments, contained within the meager confines of 5 categories. Through here, you will be able to move down into the archives by way of time or category. If you are looking for something specific, perhaps you should try the search on the sidebar.

2006-08-17 13:16:52 Шляев Юрий Александрович [@] Удалить ✕

Еще один. Комментарий от Шляева.

Хочу прокомментировать

Отправить


Добавленные файлы

История подтверждений

Комментарий	Создана	Для	Подтверждено
Задача подписана Шляев Юрий Александрович (admin)	admin	admin	2006-07-24 11:29

[Правила использования](#) | [Советы](#)

Разработано в Artics Internet Solutions на основе [Netoffice v2.5.2](#)
 Connected users: 1 - parse time 1.178 seconds - databaseType mysql - select requests 2695



Заданческий Менеджер V.2.0

Пользователь : Шилаев Юрий Александрович
 6 новых
+ Задание
+ Сообщение
Выход

Домой
Журнал
Время
Сотрудники

Кокпит
Проекты
Клиенты
Отчеты
Поддержка
Админ

Календарь -> Сентябрь 2006

Журнал рабочего времени

Разработчик : Шилаев Юрий Александрович

Месяц : Сентябрь

[Создать](#)

Всего за месяц : 54 ч. 30 мин.
 В среднем за день : 27 ч. 15 мин.
 Времени на работе : 72 ч. 32 мин.
 В среднем времени на работе в день : 8 ч. 4 мин.

Активные задания (Сентябрь 2006)

Задание	Статус	Проект	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Пошить 70 валенок	● В работе		0.8	0	0	0	0	0	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Пошить 50 валенок	● В работе		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Пошить 50 валенок	● Отложено		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Пошить 70 валенок	● В работе		0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Пошить 40 валенок на экспорт	● В работе		0	0	0	0	0.3	8	0	0	0	2	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Пошить еще 40 валенок на экспорт	● В работе		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Общее количество часов за месяц: **54.5**

По этим заданиям время не отмечалось

Нет данных

Итого

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Итого по заданиям	0.8	0	0	7	2.3	8	5.3	0	0	3.5	12.3	10.3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого по времени	0	0	0	10.1	0	8.3	9.4	4.7	0	0	11.6	10.9	0	0	0	0	0.7	12.0	0	0	0	0	0	0	0	4.9	0	0	0	

[Месяц назад](#)
|
[Сегодня](#)
|
[Месяц вперед](#)

[Правила использования](#)
|
[Советы](#)

Разработано в Artics Internet Solutions на основе Netoffice v2.5.2
 Connected users: 1 - parse time 1.324 seconds - databaseType mysql - select requests 3132

Пользователь : Шияев Юрий Александрович 6 новых + Задание + Сообщение Выход

artics ЗАДАЧЕСКИЙ МЕНЕДЖЕР V.2.0

Статус: ● На работе На перерыв Закончить рабочий день

Домой Журнал **Время** Сотрудники Кокпит Проекты Клиенты Отчеты Поддержка Админ

Время -> Шияев Юрий Александрович

Время

Дата заполнения : 2006-10-02 ...

Всего за день: 3:00

Время **вчера**: 0 ч. 00 мин.
Время **позавчера**: 0 ч. 00 мин.
Выбрано: 2006-10-02
Пришел: 11:12
Ушел: --

Успешно : Часы по заданиям обновлены

Открытые задания

Проект "Разработка проекта TMS2"

Контроллер

▲ [Разработка функциональности сорудников](#) 2006-09-22 Не начатые задания

Проект "Очередной Тестовый Проект"

Исполнитель

▼ [Первое задание внутри первой задачи](#) 2006-09-08


Проект "Разработка проекта TMS2"

Исполнитель

▲ [Проектировать что-то](#) 2006-09-20

[Правила использования](#) | [Советы](#)

Разработано в Artics Internet Solutions на основе [Netoffice v2.5.2](#)
Connected users: 1 - parse time 1.237 seconds - databaseType mysql - select requests 2739


artics ЗАДАЧНИКОВЫЙ МЕНЕДЖЕР V.2.0

Пользователь : Шилаев Юрий
6 новых
Задание
Сообщение
Выход

Статус: ● На работе
На перерыве
Закончить рабочий день

Доной
Журнал
Время
Сотрудники

Коплит
Проекты
Клиенты
Отчеты
Поддержка
Админ

[Главная страница](#) -> [Отчеты](#) -> [Отчет по графику работы](#)

Отчет : Время работы

Месяц: Октябрь - 2006 [Уточнить дату](#)
Сотрудник: Шилаев Юрий [Отчет по графику работы](#) [Журнал р. времени](#)

2006-09-11 - 2006-09-30

Времени на работе за период: 97 ч. 31 мин.
В среднем времени на работе в день: 7 ч. 58 мин.

Дата	Время	Детали	Добавить перерыв
ПН 11.9.06	--	--	
ВТ 12.9.06	01:55	14:10 - 18:59 (Обед: 14:13 - 17:07 Всего 02 ч. 54 мин.)	
СР 13.9.06	11:05	11:10 - 23:00 (Обед: 14:57 - 15:42 Всего 00 ч. 45 мин.)	
ЧТ 14.9.06	08:52	11:42 - 21:21 (Обед: 14:18 - 15:05 Всего 00 ч. 47 мин.)	
ПТ 15.9.06	06:39	11:48 - 19:13 (Обед: 14:22 - 15:08 Всего 00 ч. 46 мин.)	
СБ 16.9.06	--	--	Будни 33 ч. 43 мин. Отдых 05 ч. 12 мин.
ВС 17.9.06	--	--	Выходные 00 ч. 00 мин. Отдых 00 ч. 00 мин.
ПН 18.9.06	02:50	13:10 - 16:00	
ВТ 19.9.06	08:42	11:25 - 20:55 (Обед: 14:12 - 15:00 Всего 00 ч. 48 мин.)	
СР 20.9.06	06:29	11:51 - 19:08 (Обед: 13:59 - 14:47 Всего 00 ч. 48 мин.)	
ЧТ 21.9.06	08:08	11:10 - 20:13 (Обед: 14:11 - 15:06 Всего 00 ч. 55 мин.)	
ПТ 22.9.06	09:59	13:01 - 23:00	
СБ 23.9.06	--	--	Будни 38 ч. 39 мин. Отдых 02 ч. 31 мин.
ВС 24.9.06	--	--	Выходные 00 ч. 00 мин. Отдых 00 ч. 00 мин.
ПН 25.9.06	06:24	11:54 - 19:58 (Обед: 14:00 - 15:40 Всего 01 ч. 40 мин.)	
ВТ 26.9.06	06:33	11:46 - 19:03 (Обед: 14:10 - 14:54 Всего 00 ч. 44 мин.)	
СР 27.9.06	05:10	12:15 - 18:03 (Обед: 14:28 - 15:06 Всего 00 ч. 38 мин.)	
ЧТ 28.9.06	07:55	11:00 - 19:47 (Обед: 14:20 - 15:12 Всего 00 ч. 52 мин.)	
ПТ 29.9.06	06:50	10:59 - 18:30 (Обед: 14:28 - 15:09 Всего 00 ч. 41 мин.)	
СБ 30.9.06	--	--	Будни 37 ч. 27 мин. Отдых 04 ч. 35 мин.

Времени на работе за период: 97 ч. 31 мин.
В среднем времени на работе в день: 7 ч. 58 мин.

[Предыдущий месяц](#)
[Следующий месяц](#)

• Проблемы

- «Болезнь» всех внутренних проектов – низкий приоритет.
- Сотрудники становятся советчиками «по неволе».
- Совещания и согласования при минимуме заинтересованных.
- Разработка «для себя» -- необходимо учесть мнение каждого.
- Бюджет резко ограничен.

• Что дальше?

- Отчеты.
- Модуль взаимодействия с клиентом.
- Модуль управления рабочим временем сотрудников.
- Модуль «нотификейшенов» (оповещения).
- Модуль сообщений, новостей.
- Встраивание Bug Tracking.
- Расширение прочей функциональности, работа по улучшению интерфейса.



Опыт разработки системы управления
проектами
Artics Internet Solutions

Спасибо за внимание!

Юрий Шиляев,
директор Artics-Минск
<http://www.artics.ru>
<http://yuri.shilyaev.com>

Вопросы устно или на:
yshilyaev@artics.ru
yshilyaev@gmail.com
