



Объекты строительства

- Цех убоя бройлера в п. Костино
- Здание для содержания хряков вблизи д. Широковцы
- Каринка Лагуна 10000
- Каринка Лагуны 15000
- Ремонт Откорма, д. Прохоры, п. Костино
- Старые объекты

Справочная информация

- Формы документов для допуска
- Общие требования к ведению ИД и сдаче работ

Информация по охране труда и технике безопасности

Свод по предписаниям к качеству работ

Основная страница сайта (системы). С данной страница осуществляется навигация на страницы объектов и к нормативной и справочной информации.

Ссылка на страницу: <https://sites.google.com/view/clever-d-qc>

Доступ возможен с компьютера (ноутбука) или мобильных устройств (смартфон, планшет)





Объекты строительства

- Цех убоя бройлера в п. Костино
- Здание для содержания хряков вблизи д. Широковцы
- Каринка Лагуна 10000
- Каринка Лагуны 15000
- Ремонт Откорма, д. Прохоры, п. Костино
- Старые объекты

Справочная информация

- Формы документов для допуска
- Общие требования к ведению ИД и сдаче работ

Переход к скачиванию форм и образцов документов, необходимых для допуска к работам (нулевая папка по охране труда)

Информация по охране труда и технике безопасности

Свод по предписаниям к качеству работ



Мой диск > Объекты Клевер > Документы для допуска ▾ 👤

Название ↓

- 👤 помощь подрядчикам
- 📄 Пропуск на ТС.docx 👤
- 📄 Прил 3 Машины заполненная.docx 👤
- 📄 Прил 2 заполнение.doc 👤
- 📄 Прил 1 Список сотрудников заполнение.docx 👤
- 📄 Наклейка о прохождении ВИ.docx 👤
- 📄 Бланк письма о допуске работников .doc 👤
- 📄 Бланк письма заполненный.doc 👤
- 📄 Акт-Допуск Клевер.docx 👤
- 📄 Акт-Допуск Клевер заполненный.docx 👤

Доступны для скачивания формы документов, предоставление которых необходимо для допуска к выполнению работ на объекте, а также их заполненные образцы.

Оригиналы указанных документов представителем подрядной организации передаются должностному лицу ООО «КЛЕВЕР Девелопмент», ответственному за безопасное проведение работ на строительном объекте. Скан-копии указанных документов направляются в службу охраны труда ООО «КЛЕВЕР Девелопмент» по электронной почте [zaharov.nn@clever-d.ru](mailto:zaharov.nn@clever-d.ru) до начала выполнения работ



# Clever®

DEVELOPMENT

## Объекты строительства

- Цех убоя бройлера в п. Костино
- Здание для содержания хряков вблизи д. Широковцы
- Каринка Лагуна 10000
- Каринка Лагуны 15000
- Ремонт Откорма, д. Прохоры, п. Костино
- Старые объекты


## Справочная информация

- Формы документов для допуска
- Общие требования к ведению ИД и сдаче работ

Информация по охране труда и технике безопасности


Свод по предписаниям

Переход к справочной информации по работе в системе и приемке работ, требованиям по ведению ИД, перечням необходимой ИД




Требования к ведению документации

По нажатию на заголовок или значок в углу миниатюры документ открывается на новой вкладке.

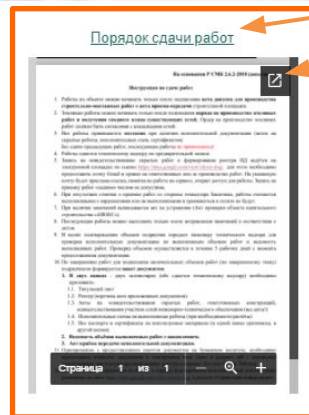


Порядок сдачи работ

Порядок сдачи-приемки выполненных работ

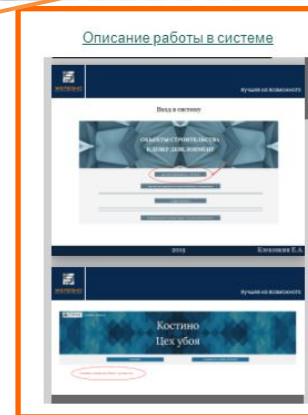


Описание работы в системе

Презентация с описанием работы в системе



Правила оформления Актов

Правила оформления актов освидетельствования скрытых работ

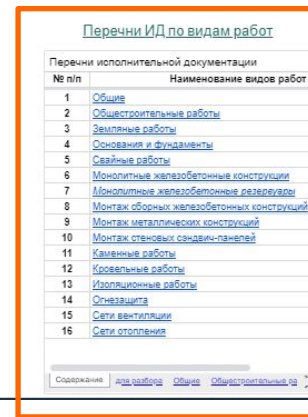

Перечни ИД по видам работ

Перечни исполнительной документации по видам работ

№ п/п	Наименование видов работ
1	<a href="#">Общие</a>
2	<a href="#">Общестроительные работы</a>
3	<a href="#">Земельные работы</a>
4	<a href="#">Основания и фундаменты</a>
5	<a href="#">Свайные работы</a>
6	<a href="#">Монолитные железобетонные конструкции</a>
7	<a href="#">Монолитные железобетонные резервуары</a>
8	<a href="#">Монтаж сборных железобетонных конструкций</a>
9	<a href="#">Монтаж металлических конструкций</a>
10	<a href="#">Монтаж стеновых сэндвич-панелей</a>
11	<a href="#">Каменные работы</a>
12	<a href="#">Кровельные работы</a>
13	<a href="#">Изоляционные работы</a>
14	<a href="#">Огнезащита</a>
15	<a href="#">Сети вентилиции</a>
16	<a href="#">Сети отопления</a>



Объекты строительства

- Цех убоя бройлера в п. Костино
- Здание для содержания хряков вблизи д. Широковцы
- Каринка Лагуна 10000
- Каринка Лагуны 15000
- Ремонт Откорма, д. Прохоры, п. Костино
- Старые объекты

Справочная информация

- Формы документов для допуска
- Общие требования к ведению ИД и сдаче работ

- Информация по охране труда и технике безопасности
- Свод по предписаниям к качеству работ

Переход к странице с информацией по охране труда





# Охрана труда

Анализ травматизма

Объекты и подрядчики

Предписания

Трехступенчатый контроль

Вводный инструктаж

**В данном разделе предоставлена информация о взаимодействии с подрядными организациями по линии охраны труда.**

**Анализ травматизма** – сведения о количестве фактов производственного травматизма и отработанных человека – часов, составленные на основе отчетов, предоставляемых подрядными организациями 1 раз в месяц;

**Объекты и подрядчики** – сведения о предоставленных документах по допуску подрядных организаций к выполнению работ на строительном объекте (нулевая папка по охране труда);

**Предписания** – сведения о составленных Актах фиксации нарушений требований охраны труда при выполнении работ с отметками о выполнении профилактических мероприятий;

**Трехступенчатый контроль** – сведения о нарушениях требований охраны труда, зафиксированных в рамках контроля, осуществляемого ответственными за безопасное производство работ и инженерами по техническому надзору;

**Вводный инструктаж** – реестр сотрудников подрядных организаций прошедших вводный инструктаж в установленном порядке





# Clever®

DEVELOPMENT

## Объекты строительства

- Цех убоя бройлера в п. Костино
- Здание для содержания хряков вблизи д. Широковцы
- Каринка Лагуна 10000
- Каринка Лагуны 15000
- Ремонт Откорма, д. Прохоры, п. Костино
- Старые объекты


## Справочная информация

- Формы документов для допуска
- Общие требования к ведению ИД и сдаче работ


Информация по охране труда и технике безопасности

Свод по предписаниям к качеству работ

Диаграмма с общей информацией по предписаниям

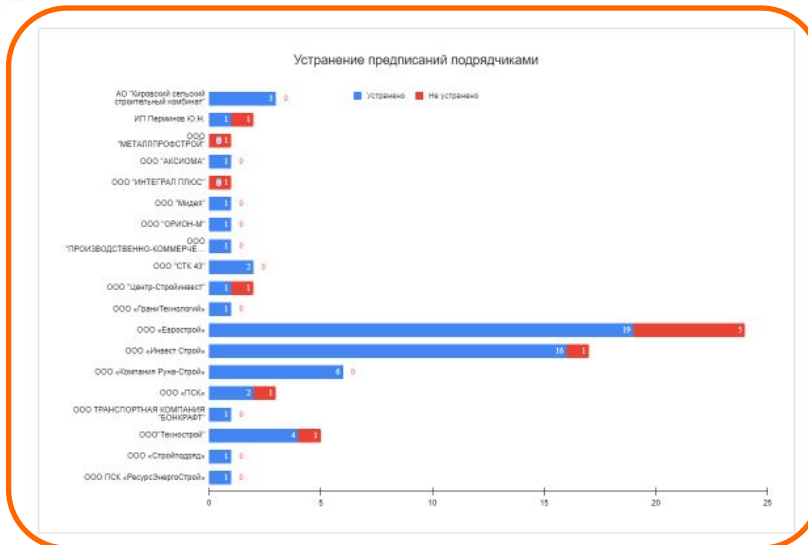


Состояние устранения предписаний с разбивкой по подрядчикам

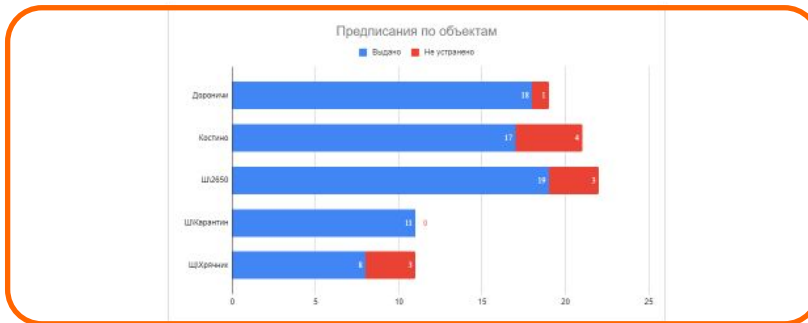

Состояние устранения предписаний с разбивкой по объектам



Подрядчики,  
которым выдавались  
предписания по  
качеству  
выполненных работ

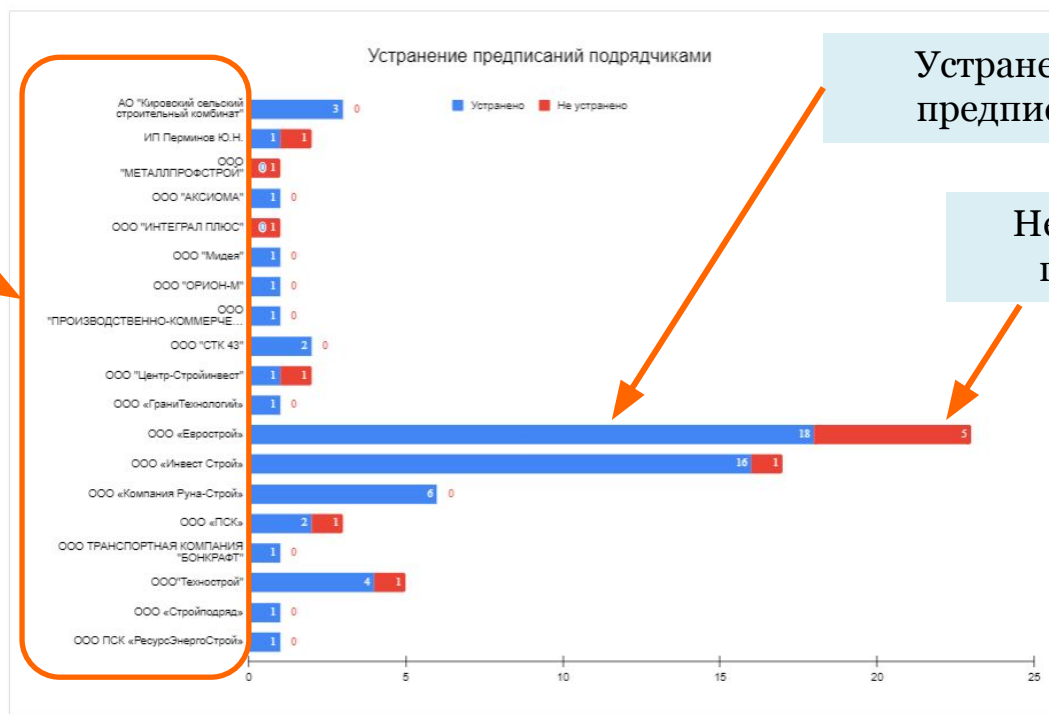

Устраненные предписания

Не устраненные предписания



# Clever®

DEVELOPMENT

## Объекты строительства

## Справочная информация

Цех убоя бройлера в п. Костино

Формы документов для допуска

Здание для содержания хряков вблизи д. Широковцы

Общие требования к ведению ИД и сдаче работ

Каринка Лагуна 10000

Каринка Лагуны 15000

Ремонт Откорма, д. Прохоры, п. Костино

Старые объекты

Информация по охране труда и технике безопасности

Свод по предписаниям к качеству работ

Выбор объекта  
строительства



Страница  
объекта



Страница для подрядчиков,  
на которой:

1. Осуществляется запись на приемку работ;
2. Размещен график загрузки Технадзора по объекту;
3. Доступен переход к таблице подрядчика;
4. Доступна таблица с выданными АПОКС по объекту.

Страница для Технического надзора:

1. Доступ к таблице по приемке работ по объекту;
2. Доступ к таблице выдачи АПОКС;
3. Доступ к реестру проверки ИД;
4. Доступ к папке для хранения ИД;
5. График загрузки;
6. Доступ к таблице настроек объекта.

К данной странице у подрядчиков нет доступа.



# КОСТИНО Цех убоа

Подрядчикам

Сотрудникам ООО "КЛЕВЕР Девелопмент"

Переход к странице Технадзора





### Сотрудникам КЛЕВЕР Девелопмент Костино Цех убоя

Таблица приемки работ

Приемка работ по записи

Внести нового подрядчика (не нас...)

Внести АПОКС (не настроен)

АПОКС

Таблица Выдачи и контроля устранения АПОКС


База чертежей (врем)

Реестр проверки Исполнительной документации от подрядчиков

График с текущими записями на приемку

Костино приемка работ

Сегодня	График загрузки по времени													0	не занято		
20.11.2020														1	осталась 1 запись		
														2	записи нет		
Дата/Время	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30			
17.11.2020																	
18.11.2020																	
19.11.2020																	
20.11.2020																	
21.11.2020																	
22.11.2020																	
23.11.2020																	
24.11.2020																	
25.11.2020																	
26.11.2020																	
27.11.2020																	
28.11.2020																	
29.11.2020																	
30.11.2020																	
01.12.2020																	
02.12.2020																	
03.12.2020																	
04.12.2020																	



ПАПКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КОСТИНО

Таблица проверки ИД и выдачи замечаний

Папка на Google диске для хранения ИД

Таблица настроек проекта

Данные проекта (таблица настроек)

Реестр исполнительной док (врем)








При поступлении новой заявки на приемку работ, в таблице технадзора (по объекту) появляется строка с данными, внесенными подрядчиком.

Информация о новой заявке также дублируется в канал в Telegram и в почту ответственного технадзора а ссылкой для перехода в таблицу приемки

№ заявки	Время записи	Дата проверки	Время проверки	Объект строительства	Подрядчик	Наименование принимаемых работ	Шифр чертежей	Разрешается прохождение последующих работ	Приняты	Замечания	Принимающий сотрудник	Причина отказа	Статья затрат	Дата и время приемки
280	24.11.2020 9:10:30	24.11.2020	10:30	Наземная насосная станция над артезианской	ООО "ЦЕНТР-СТРОЙИНВЕСТ"	армирование плит фундамента	52-19-2.1.2	армирование кладки из пеноблоков	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Шамов И.А.	изменить нумерацию сваями согласно эскизам зданий и сооружений ГП, здания имеют обозначение "Насосная над артезианской №2.1 и 2.2" Шифр чертежей нужно указывать в соответствии с номером насосной 52-19-2.1, или 52-19-2.2.		2020-11-24-10:30
281	24.11.2020 9:12:11	24.11.2020	11:00	Наземная насосная станция над артезианской	ООО "ЦЕНТР-СТРОЙИНВЕСТ"	армирование кладки из пеноблоков	52-19-2.1.2	монтаж кровли	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Шамов И.А.	изменить нумерацию сваями согласно эскизам зданий и сооружений ГП, здания имеют обозначение "Насосная над артезианской №2.1 и 2.2" Шифр чертежей нужно указывать в соответствии с номером насосной 52-19-2.1, или 52-19-2.2.		2020-11-24-11:00
282	24.11.2020 12:03:07	24.11.2020	14:00	Здание содержания хрячней	ООО "Техноград"	Монтаж ступеней с утеплением монтажного слоя	52-19-1-АС1	Отделочные работы	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Шамов И.А.			2020-11-24-14:00
283	24.11.2020 12:27:20	27.11.2020	11:00	Здание содержания хрячней	ООО "Монтажные Технологии"	Прокладка кабеля в лотках, трубах	52-19-3С2	Пусконаладка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				2020-11-27-11:00
284	25.11.2020 14:45:00	25.11.2020	15:00	Наземная насосная станция над артезианской	ООО "ЦЕНТР-СТРОЙИНВЕСТ"	Сборка технологического узла артезианской №1	52-19-2.1.2	Опрессовка узлов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				2020-11-25-15:00

После осмотра работ технадзор проставляет отметку:

1. О приемке работ или
2. Об отказе в приемке с указанием причин отказа

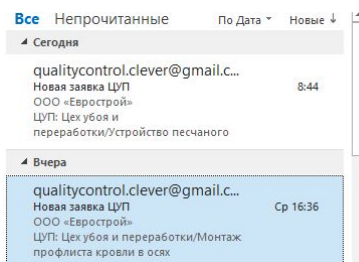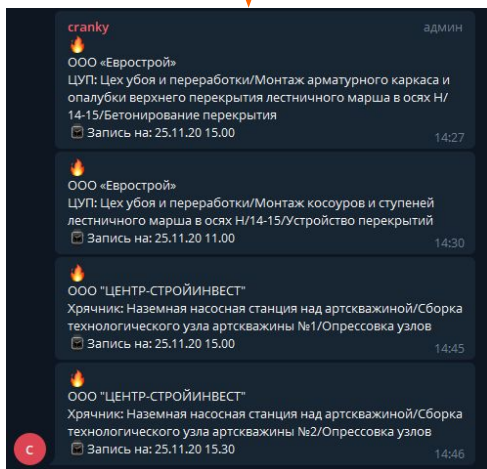



# Костино Цех убоя

Подрядчикам

Сотрудникам ООО "КЛЕВЕР Девелопмент"

Переход к странице для подрядчиков



На странице для подрядчиков доступна информация:

1. О выданных предписаниях по объекту с возможностью фильтрации по конкретному подрядчику;
2. График текущей занятости (записи) технического надзора;
3. Доступ к таблице подрядчика (для оформления Актов и формированию реестров);
4. Запись на приемку работ по объекту.

Для записи на приемку работ подрядчик заполняет форму, размещенную на странице, выбирая информацию из раскрывающихся списков (специфическую для каждого объекта) и прописывая наименование принимаемых и последующих работ.

The screenshot shows a web interface for contractors. At the top, it says "Подрядчикам Костино Цех убой". Below this is a navigation bar with "Реестр предписаний по качеству работ".

Callout 1 points to the "Реестр предписаний по качеству работ" link.

Callout 2 points to a "Костино График" window showing a Gantt chart of work hours. The chart has columns for time slots (08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30) and rows for dates from 17.11.2020 to 02.12.2020. A legend indicates "не дано" (green), "оставшаяся 1 запись" (yellow), and "записей нет" (red).

Callout 3 points to a list of contractors with buttons for each:

- Подрядчик АО Карельский ССК
- Подрядчик Группы Технологии
- Подрядчик ООО "Евротрой"
- ИП Давыдов А.В.
- Подрядчик Центр Строй Инвест
- Подрядчик ООО ПСК «Ресурс/Защита/Строй»
- Подрядчик ООО "Спецстрой"
- Подрядчик ООО "Стройин"
- Подрядчик ИП Коуров

Callout 4 points to a "Запись на приемку работ 'Костино Цех убой'" form. The form includes fields for "Дата проведения осмотра/испытания", "Время проведения осмотра/испытания", "Объект (здание, сооружение)", "Наименование организации", "Наименование работ, подлежащих осмотру/испытанию", "Мой ответ", "Шифр чертежей", and "Разрешается приемка последующих работ".







После приемки работ технадзором подрядчик вручную заполняет информацию для акта:

1. Присваивает номер акту освидетельствования скрытых работ;
2. Дублирует номер заявки и номер акта (временная мера);
3. Указывает лист проектной документации, согласно которой выполнены работы, а также **документ о согласовании** в случае отступлений от проекта;
4. Указывает примененные материалы и изделия, в **скобках** указывает документы, подтверждающие их качество;
5. Указывает наименование исполнительных схем;
6. Указывает даты начала и окончания работ согласно общего журнала работ;
7. Указывает нормативно-техническую документацию, регламентирующую выполнение работ;
8. Указывает количество экземпляров актов;
9. Указывает проектную организацию, разработавшую проект и ответственных лиц, подписывающих акты. Выбирается из выпадающих списков, соответствующих объекту.
10. При необходимости указывает дополнительную информацию.

A	B	C	D	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
№ акт	№ заявки	Дата приемки	Принято	Отказано	Проверивший сотрудник	Дублировать № заявки	Дублировать № АССР	Исполнительная документация проекта и обоснования	Примененные материалы и изделия	Исполнительная исполнительная схема	Дата начала работ	Дата окончания работ	Нормативы НТД	Восстановительная работа	Количество экземпляров	Проектная организация: наименование, ссылка на СК	Проектная организация: наименование, ссылка на СК	Проектная организация: наименование, ссылка на СК	Проектная организация	Проектная организация: наименование	Проектная организация: ссылка на СК	
тест	268	18.11.2020	FALSE	TRUE		268	тест	лист 10	Материалы и изделия (Паспорт №Box от XXX, Сертификат соответствия NEXX)	Исполнительная схема XX	18.11.2020	18.11.2020	УЗ-7 изд. "Правила устройства электроустановок"		3	Дерендяев А.В.	Шумайлов А.В.	Шамов И.А.	ООО Проектное бюро "Гражданпроект-М"	Хлебников Д.И.	Осегов А.В.	
	269	20.11.2020	TRUE	FALSE	Шамов И.А.										3	Дерендяев А.В.	Шумайлов А.В.	Шамов И.А.	ООО Проектное бюро "Гражданпроект-М"	Хлебников Д.И.		
	270	21.11.2020	TRUE	FALSE	Шамов И.А.														ООО Проектное бюро "Гражданпроект-М"	Хлебников Д.И.		
	272	23.11.2020	FALSE	FALSE					Трос стальной, коуш, крюк, жак	Исполнительная схема			УЗ-7 изд. "Правила устройства электроустановок"		3	Дерендяев А.В.	Шумайлов А.В.	Шамов И.А.	ООО Проектное бюро "Гражданпроект-М"	Хлебников Д.И.		





На основании данных, заполненных на вкладке «Реестр предъявленных работ» формируется Акт освидетельствования скрытых работ.

Для печати Акта переходим на вкладку «АОСР для печати».

В выпадающем списке выбираем №необходимого Акта, Акт заполнится данными автоматически из «Реестра предъявленных работ».

Далее стандартная печать документа из Google таблицы.

## Выбор номера Акта

## Вкладка для печати Акта

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Объект капитального строительства								
3	«Агрофирма «Дороничи» здание для содержания хряков на 80 станочном на 2/у с кадастровым №43-12-400116-71, по адресу: в/блин деревни Широковцы Кирово-Чепецкого района Кировской области. Общеплощадочные объекты								
4	<small>(наименование проектной документации, участок или строительный объект объекта капитального строительства)</small>								
5	Застройщик (технической заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)								
6	Акционерное общество «Агрофирма «Дороничи»», ОГРН 1034316504375; ИНН 4346000273; кор. адрес: 610912, Россия, Кировская область, г. Киров, пос. Дороничи, Ул. Октябрьская, д.6								
7	<small>(данные, име. отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН санкт-петербургской организации, членом которой является, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)</small>								
8	Лицо, осуществляющее строительство								
9	ООО «ЛЕВЕР Девелопмент», ОГРН 1174350010273; ИНН 4345468069; кор. адрес: РФ, 610020, г. Киров, пр-д Динамовский, д. 4; тел./факс: +7(8332)835-888; Ассоциация «СРО «Объединение строителей Кировской области», ОГРН 1094300000068; ИНН 4345249684								
10	<small>(данные, име. отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН санкт-петербургской организации, членом которой является)</small>								
11	Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации								
12	ООО Проектное бюро «Транзапроект-М», ОГРН 434501001; ИНН 4345357104; кор. адрес: РФ, 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 127, офис 400; тел./факс: +7 (8332) 71-59-01; Межрегиональное некоммерческое партнерство СРО «РЕГИОН-ПРОЕКТ»; ИНН 4345252060; КПП 434501001								
13	<small>(данные, име. отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН санкт-петербургской организации, членом которой является)</small>								
14	АКТ								
15	освидетельствования скрытых работ								
16	№акта		« 18 »		ноября		2020 г.		
17	<small>(дата составления акта)</small>								
18	Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля								
19	Руководитель отдела строительства и ремонта Даренцев А.В., идентификационный номер специалиста ИС-43-093780 от 11.09.2017г.								
20	<small>(должность, фамилия, имя/отчество, реквизиты распределительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)</small>								
21	Представитель лица, осуществляющего строительство								
22	Руководитель проекта Шмайлков А.В., идентификационный номер специалиста ИС-43-093778 от 11.09.2017г., приказ №52 от 19.05.2019г.								
23	<small>(должность, фамилия, имя/отчество, реквизиты распределительного документа, подтверждающего полномочия)</small>								
24	Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)								
25	Инженер по техническому надзору Шенков И.А., идентификационный номер специалиста ИС-43-219504 от 25.08.2020г., приказ №5 от 27.01.2020г.								
26	<small>(должность, фамилия, имя/отчество, реквизиты распределительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)</small>								
27	Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации								
28	Левашов Р.В.;								
29	ООО Проектное бюро «Транзапроект-М», ОГРН 434501001; ИНН 4345357104; кор. адрес: РФ, 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 127, офис 400; тел./факс: +7 (8332) 71-59-01; Межрегиональное некоммерческое партнерство СРО «РЕГИОН-ПРОЕКТ»; ИНН 4345252060; КПП 434501001								
30	Представитель лица, выполняющего работы, подлежащие освидетельствованию								
31	Мастер Хлебников Д.И., приказ №53, №54 от 02.10.2020г.; ООО «Монтажные Технологии»; ОГРН 1054316953208; ИНН 4345110838; кор. адрес: 610014, Кировская обл. Киров г. Потребкооперации ул. дом № 27, корпус Г, тел./факс: +7 (8332) 41-01-64								
32	<small>(должность, фамилия, имя/отчество, реквизиты распределительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)</small>								
33	в такие иные представители лиц участвующих в освидетельствовании:								
34	Мастер участка Омегов А.В., приказ №4 от 27.01.2020г.								
35	<small>(должность, с указанием наименования организации, фамилия, имя/отчество, реквизиты распределительного документа, подтверждающего полномочия)</small>								
36	провели осмотр работ, выполненных: ООО «Монтажные Технологии»								
37	<small>(наименование лица, выполняющего работы, подлежащие освидетельствованию)</small>								
38	и составили настоящий акт о нижеследующем:								
39	1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:								
40	тестовые работы: Общеплощадочные объекты								
41	<small>(наименование участка работ)</small>								
42	2. Работы выполнены по проектной документации								







Для печати реестра за конкретную дату для передачи техническому надзору переходим на вкладку «Печать реестра ИД». Для этого в ячейке В1 выбирается из выпадающего списка дата, за которую необходимо распечатать реестр. Реестр заполнится автоматически фильтрацией по выбранной дате с вкладки «Реестр ИД для ведения».

Такой способ позволяет иметь полный реестр ИД и в любой момент сформировать и распечатать реестр за любую дату либо общий.

## Выбор даты для формирования реестра

	A	B	C	D	E	F	G
1	Дата:	<input type="text"/>					
2	Заказчик-застройщик - Акционерное общество «Агрофирма «ДОРОНИЧИ»		Объект : Агрофирма "Доронины" здание для содержания хранил на 80 станкомест на з/у с кадастровым №43:12:400116:72 , по адресу: вблизи деревни Широковцы Кирово-Чепецкого района Кировской области				
3	Генподрядчик - ООО «КЛЕВЕР Девелопмент»						
4	Подрядчик - ООО "Монтажные Технологии"						
5							
6	РЕЕСТР ПЕРЕДАЧИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТ						
7	№ п/п	Наименование документа	№ документа	Дата составления документа	Организация составившая документ	Количество листов	Страница по списку
8	1	ВЫБЕРИТЕ В ЯЧЕЙКЕ В1 ДАТУ ЗА КОТОРУЮ		НУЖНО СВОРМИРОВАТЬ РЕЕСТР			
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
