

Проект

НАЗВАНИЕ

Общие положения

Наименование проекта:

Руководитель проекта:

Куратор проекта:

Администратор проекта:

Заказчик:

Инвестор:

Описание проекта

Начало реализации проекта:

Окончание проекта:

Цель:

Результат (описание продукта проекта и требований к нему):

Критерии успеха проекта:

Заинтересованные стороны

Реестр заинтересованных сторон:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Окружение проекта

Факторы, влияющие на реализацию проекта:

Требования заинтересованных сторон

Заинтересованная сторона 1

Требование 1

Требование 2

Заинтересованная сторона 2

Требование 1

Требование 2

Требования заинтересованных сторон

Заинтересованная сторона 3

Требование 1


Требование 2

Заинтересованная сторона 4

Требование 1

Требование 2

Матрица заинтересованных сторон

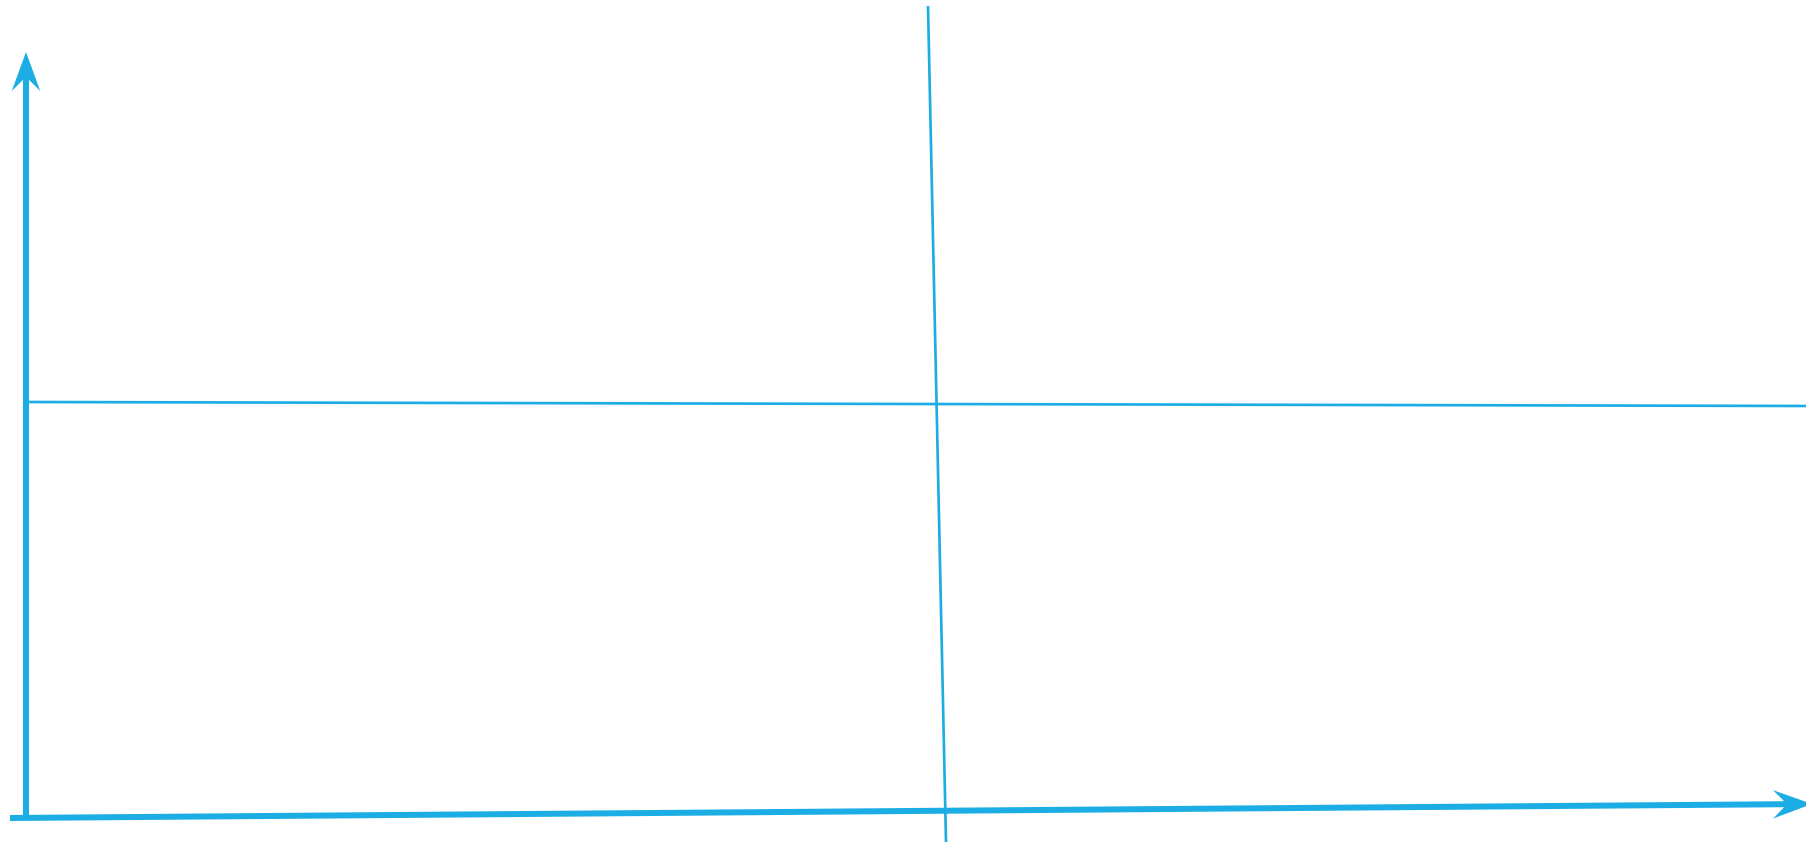

Реестр рисков проекта

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Количественная оценка рисков

	Риск	Вероятность риска	Возможные последствия	Величина риска (расчетная)	Ранг риска
1					
2					
3					

Перечень работ по проекту (таблица предшествования)

Работа	Расшифровка	Предыдущая операция	Продолжительность
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			
I			


Продолжение таблицы

J			
K			
L			
M			
N			
O			
P			

Перечень и даты контрольных мероприятий (пример)

Работа	Предыдущая операция	Время (дни)	Раннее время начала	Раннее время окончания	Позднее время начала	Позднее время окончания	Резерв
A	-	1					
B	A	21					
C	B	20					
D	C	1					
E	C	5					
F	C	5					
G	E	21					
H	F	21					
I	G H	7					
J	I	21					
K	J	20					
L	K	5					
M	D	7					
N	L M	14					
O	N	7					
P	O	1					

Сетевой график (приведен пример, **красным** – критический путь)

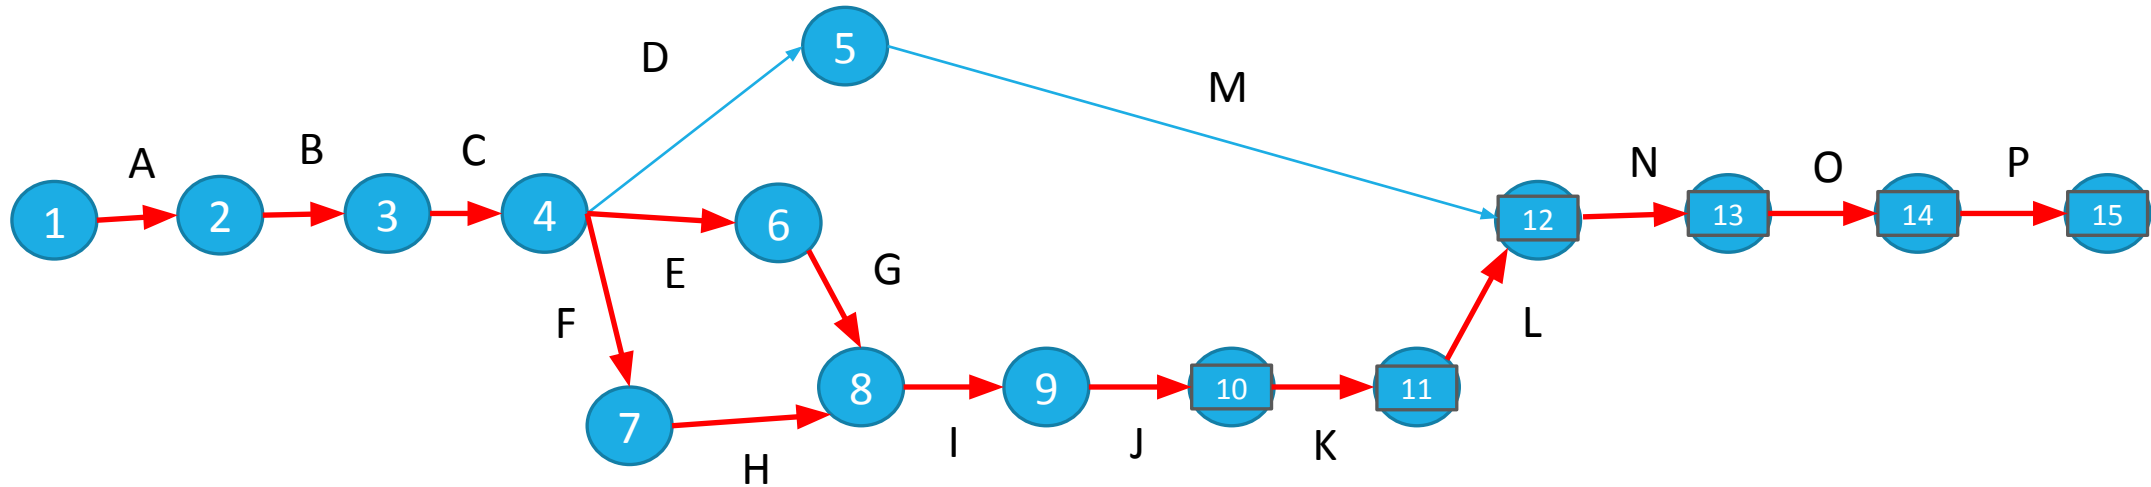

Матрица ответственности

О – ответственный, И – исполнитель,
К – консультант, Н - наблюдатель

Ф.и.о	Иванов	Петров	Сидоров	
Работа				
А	О,И			
В		Н		
С			К	
Д	О	И		
Е			О	О
Ф				

Календарный график (Диаграмма Ганта) *приведен пример*

